

**Informe Nacional
Estado de Avance**

**Proyectos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones
3er. Trimestre 2025 – septiembre 2025**

DESCRIPCIÓN GENERAL

El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) es un instrumento del Gobierno de Chile destinado a mejorar la cobertura de telecomunicaciones, con especial énfasis en zonas rurales y de bajos ingresos.

A través de concursos públicos, este fondo busca reducir las brechas de conectividad en áreas aisladas del país, otorgando subsidios a concesionarios y/o permisionarios de telecomunicaciones para el despliegue de infraestructura necesaria.

Las empresas adjudicatarias deben cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente y en las bases de cada concurso. Las zonas de cobertura corresponden a áreas geográficas delimitadas, priorizando sectores con alta concentración poblacional, según el alcance de cada proyecto.

A continuación, se detalla el estado actual de los proyectos el FDT, incluyendo iniciativas en operación, en proceso de implementación y las contraprestaciones de licitación de espectro correspondientes a concursos SUBTEL sin asignación de subsidio.

Tabla 1 - Proyectos FDT

Proyecto / Concurso	Subsidio	Servicio de telecomunicaciones	Año adjudicación	Término de período de obligatoriedad	Beneficio a nivel nacional	Avance
Construcción de Despliegue de Fibra Óptica entre las localidades de Tortel y Villa O'Higgins	\$ 7.218.941.000	Infraestructura para telecomunicaciones	-	20 años	-	Evaluación de propuestas sep -25
Última Milla Región de Atacama	\$ 7.420.736.000	Infraestructura para telecomunicaciones y servicios móviles	-	20 años Infraestructura 10 años telefonía móvil	37 localidades	No se registraron propuestas ago -25
Última Milla Los Lagos (2° llamado) y Coquimbo.	\$9.090.448.422 (Los Lagos) \$6.448.888.000 (Coquimbo)	Infraestructura para telecomunicaciones y servicios Fijo	-	20 años Infraestructura 10 años telefonía móvil	199 localidades (Los Lagos) 26 localidades (Coquimbo)	Recepción de consultas ago-25 Evaluación de propuestas ene -26
Transferencia Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones Fibra Óptica Nuble – Última Milla	\$ 4.793.624.177	Infraestructura para telecomunicaciones	jun25	20 años	Etapas 1: 54 localidades	Adjudicado
Conectividad para la Educación 2011	\$16.540.894.000	Transmisión de datos (Internet gratuito)	jul-11	Extendido a diciembre 2025	15 regiones 574 Establecimientos educativos	100% en operación
Conectividad para la Educación 2030			1er. Llamado: dic-20 2do. Llamado: dic-21 3er. Llamado: mar-23 4to. Llamado: mar-25	dic-29	15 regiones 8.868 Establecimientos educativos	1er, 2do, 3er llamado: 100% implementación 4to llamado: notificación de adjudicación
Implementación de Sistemas de Transmisión para la Televisión Digital Terrestre	\$ 2.435.529.723	Servicio de TVD (migración)	1er. llamado: mar-24 2do. llamado: nov-24	5 años	Nacional	En implementación, Recepción de obras y Operativo.

Proyecto / Concurso	Subsidio	Servicio de telecomunicaciones	Año adjudicación	Término de período de obligatoriedad	Beneficio a nivel nacional	Avance
Última Milla Los Lagos	\$ 5.744.203.578	1) Infraestructura para telecomunicaciones 2) Oferta de servicios de transmisión de datos para Internet Hogar	dic-23	1) 20 años 2) 10 años	172 localidades	Proceso de ingreso de Informe de Ingeniería de Detalles
Habilitación Fibra Óptica Tarapacá	\$ 5.860.580.000	Servicio intermedio de infraestructura	dic-21	20 años	7 comunas 15 localidades	69% implementado
Fibra Óptica en Complejos Fronterizos Zona Geográfica Sur	\$ 3.969.712.250	Servicio intermedio de infraestructura	ZG Sur: ago-21	dic-43	4 complejos Fronterizos	100% en operación
Servicios de telecomunicaciones para Zonas WiFi 2.0	\$ 3.459.154.310	Transmisión de datos (Internet gratuito)	1er. Llamado: may-20 2do. Llamado: may-21	1er. Llamado: dic-24 2do. Llamado: dic-25	8 regiones 508 Zonas WiFi	ZW con período de obligatoriedad vigente 100% en operación
Fibra Óptica Nacional	\$75.093.899.822	Servicio intermedio de infraestructura	MZ Arica y Parinacota, Norte, Centro-Norte, Centro y Centro Sur: abr-20 MZ Sur: abr-21	AYP: ene-45 NTE: Jun-45 CTO-NTE: dic-43 CTO: sep-43 CTO-SUR: may-44	13 regiones 204 comunas	MZ Arica y Parinacota, Norte, Centro-Norte, Centro y Centro-Sur: 100% en operación Sur 82% Implementado
Fibra Óptica Austral	\$57.580.830.931	Servicio intermedio de infraestructura	Submarina y Magallanes: oct-17 Los Lagos y Aysén: may-19	Submarina: dic-39 Magallanes: ene-40 Los Lagos – Aysén: mar-42	3 regiones	100% en operación

Tabla 2 - Contraprestaciones espectro SUBTEL

Contraprestación	Servicio de telecomunicaciones	Año adjudicación	Término de período de obligatoriedad	Beneficio a nivel nacional	Avance
Concurso 2,6 GHz	Oferta de Transmisión de datos (Internet)	2012	Mar-43	15 regiones (181 localidades)	100% en operación
Concurso 700 MHz	Oferta de Transmisión de datos (Internet) y telefonía móvil	2014	Sep-45	16 regiones (1.281 localidades, 13 rutas)	100% en operación
Concurso 5G 700 MHz	Oferta de transmisión de datos (Internet) y telefonía móvil con tecnología LTE Advanced Pro y 5G	2020	30 años	16 regiones (366 localidades)	57% en operación

PROYECTOS EN ETAPA CONCURSAL, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

1. CONSTRUCCIÓN DE DESPLIEGUE DE FIBRA ÓPTICA ENTRE LAS LOCALIDADES DE TORTEL Y VILLA O'HIGGINS – EN ETAPA DE RECEPCIÓN DE CONSULTAS A LA BASES - SUBSIDIO REGIONAL - SUBSIDIO REGIONAL DISPONIBLE \$7.218.941.000.-

El objetivo de esta nueva infraestructura es mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en la comuna de O'Higgins.

Su implementación complementará los avances logrados mediante los proyectos Troncal Submarina Austral y Troncal Terrestre Aysén, adjudicados a las empresas Comunicación y Telefonía Rural S.A. y Silica Networks Chile S.A., respectivamente, a través de los concursos públicos Fibra Óptica Austral (Códigos FDT-2017-01 y FDT-2018-02).

Con ello se busca reducir la brecha digital que afecta a sus habitantes, facilitando el acceso a servicios de telecomunicaciones más eficientes y accesibles para la comunidad.

El Concurso fue publicado el 17 de marzo de 2025 y, dentro de los plazos establecidos en las Bases de Concurso, se recibió una Propuesta, la cual está siendo evaluada por la Comisión de Evaluación designada por esta Subsecretaría. Una vez terminado este proceso, se realizará la presentación de los resultados de la evaluación al Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, quien determinará la eventual adjudicación de este Concurso. Lo anterior se llevará a cabo durante el último trimestre 2025.

Para mayor información se puede visitar la página <http://www.subtel.gob.cl/vohiggins2024/>

2. ÚLTIMA MILLA ATACAMA – EN ETAPA DE RECEPCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES – SUBSIDIO REGIONAL DISPONIBLE \$7.420.736.000.-

El FDT generó y presentó un Anteproyecto de Última Milla para la región de Atacama que contempla beneficiar 37 localidades, entregando un servicio de infraestructura y voz-datos móviles, el cual fue aprobado por el Consejo Regional y Gobierno Regional.

El concurso fue publicado el 17 de marzo de 2025 y hasta el día 19 junio estuvo habilitada la recepción de propuesta. Actualmente se determinó presentar al CDT para la declaración desierta del concurso.

Las localidades contempladas a ser beneficiadas son las siguientes:

Tabla 3 - Localidades a beneficiar - ÚM Atacama

Comuna	Localidad	Solución
Alto del Carmen	Cerro Blanco	P. Derivación (Infraestructura)
Alto del Carmen	Chancoquín	P. Derivación (Infraestructura)
Alto del Carmen	Crucecita	P. Derivación (Infraestructura)
Alto del Carmen	El Parral	P. Derivación (Infraestructura)
Alto del Carmen	El Tránsito	P. Derivación (Infraestructura)
Alto del Carmen	La Angostura	P. Derivación (Infraestructura)
Alto del Carmen	La Arena Alta	P. Derivación (Infraestructura)
Alto del Carmen	La Arena Baja	P. Derivación (Infraestructura)
Alto del Carmen	La Majada	P. Derivación (Infraestructura)
Alto del Carmen	La Vega	P. Derivación (Infraestructura)
Alto del Carmen	Las Pircas	P. Derivación (Infraestructura)
Alto del Carmen	Los Tambos	P. Derivación (Infraestructura)
Alto del Carmen	Quebrada de Colpe	P. Derivación (Infraestructura)
Alto del Carmen	Retamo	P. Derivación (Infraestructura)
Alto del Carmen	Alto del Carmen	POIIT (Infraestructura)
Alto del Carmen	Conay	POIIT (Infraestructura)
Alto del Carmen	La Marquesa	POIIT (Infraestructura)
Alto del Carmen	Quebrada de Pinte	POIIT (Infraestructura)
Alto del Carmen	San Felix	POIIT (Infraestructura)
Copiapó	Caleta Totoral	POIIT (Infraestructura)
Copiapó	Totoral	POIIT (Infraestructura)
Diego de Almagro	Diego de Almagro	POIIT (Infraestructura)
Diego de Almagro	Inca de Oro	POIIT (Infraestructura)
Freirina	Carrizalillo	POIIT (Infraestructura)
Freirina	Chañaral de Aceituno	POIIT (Infraestructura)
Huasco	El Pino	POIIT (Infraestructura)
Tierra Amarilla	Amolanas	POIIT (Infraestructura)

Comuna	Localidad	Solución
Tierra Amarilla	Los Loros	POIIT (Infraestructura)
Vallenar	Domeyko	POIIT (Infraestructura)
Vallenar	Vallenar	POIIT (Infraestructura)
Alto del Carmen	El Sauce	Voz-Datos Móviles
Alto del Carmen	El Solar	Voz-Datos Móviles
Alto del Carmen	El Sombrío	Voz-Datos Móviles
Alto del Carmen	La Majada	Voz-Datos Móviles
Alto del Carmen	Quebrada de Pinte	Voz-Datos Móviles
Alto del Carmen	Retamo	Voz-Datos Móviles
Caldera	Sector Copa de Agua	Voz-Datos Móviles
Caldera	Sector Rodillo	Voz-Datos Móviles
Chañaral	Barquito	Voz-Datos Móviles
Chañaral	Barrio Industrial	Voz-Datos Móviles
Copiapó	Bodega	Voz-Datos Móviles
Copiapó	San Pedro	Voz-Datos Móviles
Freirina	Agua Salada	Voz-Datos Móviles
Freirina	La Pólvora	Voz-Datos Móviles
Freirina	Maitencillo	Voz-Datos Móviles
Freirina	Nicolasa	Voz-Datos Móviles
Huasco	Carrizal Bajo	Voz-Datos Móviles
Tierra Amarilla	Amolanas	Voz-Datos Móviles
Tierra Amarilla	Casa Rosada	Voz-Datos Móviles
Tierra Amarilla	Casa Vieja	Voz-Datos Móviles
Tierra Amarilla	La Apacheta	Voz-Datos Móviles
Tierra Amarilla	Palo Blanco	Voz-Datos Móviles
Tierra Amarilla	Río Blanco	Voz-Datos Móviles
Tierra Amarilla	San Antonio	Voz-Datos Móviles
Tierra Amarilla	Siete Amigos	Voz-Datos Móviles
Tierra Amarilla	Valle Hermoso	Voz-Datos Móviles
Tierra Amarilla	Viña del Cerro	Voz-Datos Móviles
Vallenar	Agua Amarga	Voz-Datos Móviles
Vallenar	Camarones	Voz-Datos Móviles
Vallenar	El Churque	Voz-Datos Móviles
Vallenar	El Collao	Voz-Datos Móviles
Vallenar	El Colmo	Voz-Datos Móviles
Vallenar	Hacienda Compañía	Voz-Datos Móviles
Vallenar	La Porota	Voz-Datos Móviles
Vallenar	La Verbena	Voz-Datos Móviles
Vallenar	Llanos de Palacios	Voz-Datos Móviles
Vallenar	Quebrada la Higuera	Voz-Datos Móviles

Para mayor información se puede visitar la página: <http://www.subtel.gob.cl/atacama2023/>

3. CONCURSO PÚBLICO “TRANSFERENCIA FONDO DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES FIBRA ÓPTICA ÑUBLE – ÚLTIMA MILLA” – ADJUDICADO – SUBSIDIO MÁXIMO \$4.793.624.177.-

Este proyecto tiene por objetivo principal ampliar la infraestructura óptica en la región de Ñuble, permitiendo mejorar la cobertura de servicios fijos. A través del despliegue de fibra óptica, busca garantizar el acceso a Internet de alta calidad y potenciar el desarrollo de nuevas iniciativas en telecomunicaciones, beneficiando a la comunidad y fomentando la conectividad regional.

Para alcanzar los objetivos planteados, el programa se ha diseñado en dos etapas, cada una correspondiente a un llamado a concurso en forma secuencial, dependiendo de disposición por parte del Gobierno Regional de Ñuble.

1. El proyecto, formulado en conjunto con la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional de Ñuble, tiene como propósito la construcción de una infraestructura de fibra óptica troncal neutra. Esta infraestructura permitirá complementar la cobertura del proyecto Fibra Óptica Nacional en aquellas comunas y localidades que no fueron incluidas, garantizando una mayor cobertura en los territorios.
2. Esta infraestructura permitirá mejorar la cobertura de Internet Hogar mediante dos enfoques:
 1. Despliegue de redes de fibra óptica hasta el hogar (FTTH – Fiber to the home), dirigido a localidades con mayor concentración de viviendas.
 2. Provisión de Internet inalámbrico (WISP – Wireless Internet Service Provider), enfocado en zonas con población más dispersa.

En la siguiente tabla se muestran los puntos de Operación e Interconexión de Infraestructura de Telecomunicaciones adjudicados en la etapa 1 del proyecto Última Milla Ñuble.

Tabla 4 - Localidades Beneficiadas ÚM Ñuble E1

Provincia	Comuna	Localidad
Itata	Cobquecura	Buchupureo
Itata	Coelemu	Perales
Itata	Coelemu	Ranguelmo
Itata	Quillón	Villa Las Mercedes
Punilla	Coihueco	Minas del Prado
Punilla	Coihueco	Cato
Diguillín	Chillán	Quinchamali
Diguillín	Chillán Viejo	Chillán Viejo
Diguillín	Bulnes	Bulnes
Diguillín	Pemuco	General Cruz
Diguillín	Bulnes	Tres Esquinas
Diguillín	San Ignacio	Pueblo Seco
Diguillín	Yungay	Campanario
Diguillín	Pinto	Recinto
Diguillín	Bulnes	Bulnes

El Proyecto en su etapa 1, fue adjudicado por el Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, en su sesión LXXXVI del 06 de junio de 2025, a la empresa COPELEC Ltda., por un subsidio de \$ 4.793.624.177.- Con fecha 25 de junio, la Adjudicataria ingresó la solicitud de Concesión y la Boleta de Garantía de Inicio de Servicio de Infraestructura. Con fecha 15 de septiembre de 2025 la Contraloría General de la República tomó de razón el Decreto de Concesión y fue notificado a la empresa, para su publicación en el Diario Oficial.

Para mayor información se puede visitar la página: <http://www.subtel.gob.cl/ultimamilla-nuble/>

4. CONECTIVIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUBSIDIO ANUAL DISTRIBUIDO ENTRE CPE 2011 Y CPE 2030 \$16.540.894.000.-

a. 2011 – EN OPERACIÓN

Desde 2010 el proyecto “Conectividad para la Educación” ha sido una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Su objetivo es garantizar el acceso gratuito a Internet para todas las escuelas municipales y particulares subvencionadas del país.

Dado su impacto de la iniciativa, el Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en su sesión LXXXIII del 18 de octubre de 2024, aprobó su extensión hasta diciembre de 2025.

A septiembre de 2025, 574 establecimientos educacionales continúan beneficiándose con el servicio operativo en Conectividad para la Educación 2011. Estos irán migrando al proyecto Conectividad para la Educación 2030 durante el transcurso de este año.

Tabla 5 - Distribución EE CpE 2011

Región	Nº de EE conectados	Nº de alumnos
Arica y Parinacota	2	98
Tarapacá	3	263
Antofagasta	4	129
Atacama	76	40.545
Coquimbo	11	1.359
Valparaíso	15	4.173
Metropolitana	50	16.824
Libertador General Bernardo O'Higgins	3	39
Maule	232	69.107
Ñuble	7	395
Biobío	55	9.986
Araucanía	11	1.407
Los Ríos	18	516
Los Lagos	25	3.927
Magallanes	62	25.530
Total	574	174.298

b. 2030 – EN OPERACIÓN (1ER., 2DO., 3ER. LLAMADO) – IMPLEMENTACIÓN (4TO. LLAMADO) - 5to. LLAMADO EN ETAPA CONCURSAL.

La iniciativa de CpE 2030 abarca 70 zonas de postulación independientes, en donde se han realizado 4 llamados a concurso y está en publicación el 5to. llamado correspondiente a la zona de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

En diciembre 2020, el Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones adjudicó 54 zonas en donde se incluyen 8.343 EES a 9 empresas adjudicatarias. Este llamado ya se encuentra totalmente finalizado, por lo que todos los EES cuentan con los servicios instalados.

El 31 de marzo de 2021, el Consejo autorizó un segundo llamado a concurso para así re licitar 15 de las 16 zonas que no fueron adjudicadas en la primera convocatoria. Este concurso se publicó el 16 de junio de 2021, con recepción de propuestas hasta el 13 de septiembre del mismo año y adjudicaciones en diciembre de 2021, completando esta etapa del proyecto. Durante este proceso se adjudicaron dos zonas postulación con 266 nuevos EES.

Posteriormente, el 5 de septiembre de 2022, se lanzó un tercer llamado a concurso, cuya adjudicación se realizó el 17 de marzo de 2023. En esta tercera fase se convocaron doce zonas de postulación de las cuales se adjudicaron 8 zonas con un total de 688 EES beneficiados.

Tabla 6 – Distribución EES CpE 2030

Región	N° de EE conectados	N° de alumnos
Arica y Parinacota	119	48.195
Tarapacá	161	75.659
Antofagasta	178	112.329
Atacama	60	16.230
Coquimbo	611	154.480
Valparaíso	1.048	316.534
Metropolitana	2.390	1.097.366
Libertador General Bernardo O'Higgins	631	181.036
Maule	441	131.392
Ñuble	356	90.277
Biobío	824	266.078
Araucanía	915	193.091
Los Ríos	355	71.664
Los Lagos	741	151.604
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	77	21.713
Total	8.907	2.927.648

El 5 de septiembre de 2024 se realizó la publicación del cuarto llamado a concurso. Esta etapa considera la adjudicación de 5 zonas, dentro de las cuales se encuentran alrededor de 570 EES. La adjudicación se realizó el 14 de marzo de 2025, adjudicando cuatro zonas de postulación con un total de 482 EES.

El detalle de adjudicación del 4to. Llamado fue el siguiente:

Tabla 7 – Destalle de adjudicación 4to. llamado. EES CpE 2030

Zonas	Comunas	Subsidio anual adjudicado	Adjudicataria
Zona 06	Calderas, Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro, Tierra Amarilla	\$189.631.080	Netland Chile S.A.
Zona 43	Curepto, Curicó, Hualañé, Licantén, Molina, Rauco, Río Claro, Romeral, Sagrada Familia, Teno, Vichuquén	\$347.307.821	Netland Chile S.A.
Zona 45	Cauquenes, Chanco, Constitución, Empedrado, Pelluhue	\$130.780.392	Netland Chile S.A.
Zona 56	Cañete, Contulmo, Tirúa	\$131.328.000	Texus Networks SpA.
TOTAL		\$799.047.293	

Actualmente, se están tramitando en Contraloría General de la República los decretos de concesión respectivos a cada zona.

El Consejo autoriza la realización de un 5to. llamado para la zona de Magallanes, el cual fue publicado en el Diario Oficial N°44.167, con fecha 6 de junio de 2025 y publicado en la Web de Subtel en el siguiente enlace: <http://www.subtel.gob.cl/cpe2030-5>

Respecto al 5to Llamado, se realizó el acto de apertura de las propuestas el viernes 22 de agosto. El plazo para la evaluación de las propuestas es hasta el martes 7 de octubre de 2025.

Para mayor información se pueden visitar las páginas web: <http://www.subtel.gob.cl/cpe2030>, <http://www.subtel.gob.cl/cpe2030-2>, <http://www.subtel.gob.cl/cpe2030-3> y <http://www.subtel.gob.cl/cpe2030-4>

5. SISTEMAS DE TRANSMISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE – EN IMPLEMENTACIÓN – SUBSIDIO ASIGNADO \$2.435.529.723.-

El objetivo de esta iniciativa es subsidiar la implementación de Sistemas de Transmisión para Televisión Digital compatibles con el estándar ISDB-T, con el fin de ampliar la cobertura digital en las zonas donde actualmente la radiodifusión televisiva de libre recepción opera en formato analógico.

Este subsidio busca facilitar la migración de la tecnología analógica a la digital, permitiendo la implementación y el despliegue de servicios de radiodifusión televisiva digital de libre recepción a nivel nacional. La iniciativa pone especial énfasis en fortalecer la cobertura regional y local, además de apoyar la transmisión comunitaria, promoviendo así un acceso más equitativo a la televisión digital en todo el país.

Se establecen dos tipos de concursos, con sus respectivas exigencias:

1. Zona de postulación regional o local: Cumplimiento con los requisitos asociados a la categoría de concesionaria regional o local. Entre ellos cuentan aquellas proponentes que hayan solicitado la reserva de las frecuencias asociadas al proceso de migración de tecnología analógica a digital.
2. Zona de postulación local de carácter comunitario: Cumplimiento a los requisitos para detentar la categoría de concesionaria local de carácter comunitario.

Tabla 8 - Primer período de postulación TVD

Zona De Postulación	Beneficiaria	Subsidio	Estado
Alto Del Carmen - 1	Edwin Holvoet Y Compañía Limitada	\$43.900.000	Operativo
Antofagasta - 3	Corporación Iglesia De Los Adventistas Del Séptimo Día	\$66.900.000	Operativo
Antofagasta - 4	Edwin Holvoet Y Compañía Limitada	\$58.900.000	En implementación
Arica-6	Christian Villavicencio Cortés Producciones E.I.R.L.	Desiste	Desiste
Cabildo - 7	Inversiones En Comunicaciones Litoral De Los Poetas Ltda.	\$58.900.000	Operativo
Calama - 8*	Edwin Holvoet Y Compañía Limitada	\$63.382.894	En implementación
Caldera - 10*	Edwin Holvoet Y Compañía Limitada	\$54.700.000	Operativo
Casablanca - 11	Inversiones En Comunicaciones Litoral De Los Poetas Ltda.	\$58.900.000	Operativo
Chañaral - 12	Edwin Holvoet Y Compañía Limitada	\$54.540.976	En implementación

Zona De Postulación	Beneficiaria	Subsidio	Estado
Chillán - 13	Corporación Iglesia De Los Adventistas Del Séptimo Dia	\$66.900.000	Operativo
Concepción - 14	Corporación Iglesia De Los Adventistas Del Séptimo Dia	\$66.900.000	Operativo
Diego De Almagro - 16*	Edwin Holvoet Y Compañía Limitada	\$43.900.000	Operativo
Domeyko - 17*	Edwin Holvoet Y Compañía Limitada	\$43.900.000	En implementación
El Salvador - 18*	Edwin Holvoet Y Compañía Limitada	\$51.896.266	Operativo
Huasco - 19*	Edwin Holvoet Y Compañía Limitada	\$51.896.266	Operativo
Iquique y Alto Hospicio - 21*	Edwin Holvoet Y Compañía Limitada	\$63.787.104	En implementación
La Serena y Coquimbo - 22	Zambra Telecomunicaciones Limitada	\$58.000.000	Operativo
La Serena y Coquimbo-23	Altronix Comunicaciones Limitada	Desiste	Desiste
Los Ángeles - 24	RDT S.A.	\$65.000.000	Operativo
Los Loros - 25*	Edwin Holvoet Y Compañía Limitada	\$43.900.000	En implementación
Osorno - 26	Universidad De Los Lagos	\$58.000.000	Operativo
Ovalle - 27*	Zambra Telecomunicaciones Limitada	\$58.000.000	Operativo
Punta Arenas - 30*	Universidad De Magallanes	\$65.000.000	En implementación
Salamanca - 33	Hugo Quiroga E Hijo Limitada	\$54.700.000	Operativo
Temuco - 36	Corporación Iglesia De Los Adventistas Del Séptimo Dia	\$66.900.000	Operativo
Vallenar - 40*	Edwin Holvoet Y Compañía Limitada	\$58.125.217	Operativo
Valparaíso y Viña Del Mar - 41	RDT S.A.	\$65.000.000	Operativo
Total		\$1.441.928.723	

*Las zonas de postulación se encuentran con solicitud de calificación de hecho sobreviniente autorizado por SUBTEL.

Tabla 9 - Segundo período de postulación TVD

Zona de Postulación	Proponente	Subsidio solicitado	Estado
Local – Copiapó*	Open Group Comunicaciones Spa	\$58.500.500	En proceso de RxO
Local - Puerto Montt	Vtv Spa	\$58.500.500	Operativo
Local - Punta Arenas	Radio Polar Spa.	\$55.000.000	Operativo
Local Comunitario – Concepción - Talcahuano	Asociación Audiovisual Digital El 3 de Conce	\$43.950.000	Operativo
Local Comunitario - Padre Hurtado	Centro Comunicacional Cultural Social Deportivo Educativo y Recreativo Islita TV	\$43.950.000	Operativo
Local Comunitario - Pedro Aguirre Cerda**	Centro Cultural, Comunicacional y Radiofónico San Miguel	\$43.950.000	En implementación
Local Comunitario - Peñalolén	Centro Juvenil Entre Nubes	\$43.950.000	Operativo
Local Comunitario - Puente Alto	Club Deportivo Bajos de Mena Social y Cultural	\$43.950.000	Operativo
Local Comunitario - Quilicura	Fundación Cultural Vecinal Santiago Norte	\$43.950.000	Operativo
Local Comunitario - San Nicolás	Fundación Arte Cultura Educación y Patrimonio	\$43.950.000	Operativo
Local Comunitario - Temuco	Agrupación de Audiovisualistas Abajo E'la Línea	\$43.950.000	Operativo
Regional – Concepción*	Altronix Comunicaciones Limitada	\$60.000.000	Operativo
Regional - La Serena Y Coquimbo*	Altronix Comunicaciones Limitada	\$46.000.000	Operativo
Regional - Los Ángeles	Corporación Iglesia de Los Adventistas del Séptimo Día	\$65.000.000	Operativo
Regional - Puerto Natales	Televisión de La Patagonia Itv Limitada	\$65.000.000	Operativo
Regional - Punta Arenas	Soberanía Limitada	\$48.000.000	Operativo
Regional - Talca	Altronix Comunicaciones Limitada	\$56.000.000	En proceso de RxO
Regional - Talca	Corporación Iglesia de Los Adventistas del Séptimo Día	\$65.000.000	Operativo
Regional – Valparaíso*	Corporación Iglesia de Los Adventistas del Séptimo Día	\$65.000.000	Operativo
Total		\$993.601.000	

*Las zonas de postulación se encuentran con solicitud de calificación de hecho sobreviniente autorizado por SUBTEL.

**Las zonas de postulación se encuentran con solicitud de calificación de hecho sobreviniente en análisis de SUBTEL.

Para mayor información se pueden visitar las páginas web: <http://www.subtel.gob.cl/fdt-2023-01-periodo-de-postulacion-n-1/> y <http://www.subtel.gob.cl/fdt-2023-01-periodo-de-postulacion-n-2/>

6. HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA REGIÓN DE LOS LAGOS Y LA REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA – EN PROCESO DE ELABORACION DEL IID – SUBSIDIO ASIGNADO \$5.744.203.578.-

Este proyecto fue impulsado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones en colaboración con los Gobiernos Regionales de Los Lagos y Magallanes y la Antártica Chilena, el cual tiene como propósito la implementación, operación y gestión de infraestructura de fibra óptica para telecomunicaciones y otorgar servicios de internet hogar a los usuarios finales. Su objetivo principal es ampliar la cobertura de Internet fijo en los hogares de ambas regiones, garantizando el acceso a un servicio público de conectividad en zonas con baja o nula disponibilidad de Internet.

Durante el proceso de licitación del proyecto, sólo se adjudicaron determinadas zonas de la región de Los Lagos, mientras que en la región de Magallanes y la Antártica Chilena no se presentaron oferentes. Como resultado, la implementación de infraestructura está centrada en las áreas adjudicadas de la región de Los Lagos, quedando pendiente la asignación de servicios para la región de Magallanes y la Antártica Chilena, lo que requiere la evaluación de nuevas estrategias para garantizar un proyecto de estas características en dicha región.

Las zonas adjudicadas en la región de Los Lagos son las siguientes:

Tabla 10 - Resultados zonas adjudicadas - ÚM Los Lagos

Adjudicataria	Zona	Subsidio	Características Pt
Silica Networks Chile S.A.	2	\$791.061.338	17 localidades, 4 Pop-Olt, 96 Cov
Pacífico Cable Spa	3	\$2.352.718.570	59 localidades, 20 Pop-Olt, 288 Cov
Pacífico Cable Spa	5	\$1.208.032.267	43 localidades, 25 Pop-Olt, 288 Cov
Silica Networks Chile S.A.	6	\$1.106.636.066	46 localidades, 9 Pop-Olt, 96 Cov
Silica Networks Chile S.A.	7	\$285.755.337	7 localidades, 5 Pop-Olt, 96 Cov
TOTAL		\$5.744.203.578	

Las zonas 1, 4, 8 y 9 quedaron desiertas y están siendo impulsadas en un próximo nuevo llamado a licitación.

Tabla 11 - Localidades beneficiadas ÚM Los Lagos según adjudicación

Zona	Comuna	Localidad
Lz02	Puerto Montt	Chaica
Lz02	Puerto Montt	Chamiza
Lz02	Puerto Montt	Coihuin
Lz02	Puerto Montt	Colonia Alerce
Lz02	Puerto Montt	Colonia Tres Puentes
Lz02	Puerto Montt	Correntoso
Lz02	Puerto Montt	La Arena
Lz02	Puerto Montt	La Poza
Lz02	Puerto Montt	Lenca
Lz02	Puerto Montt	Lomas De Coihuin
Lz02	Puerto Montt	Metri
Lz02	Puerto Montt	Pichiquillaiepe
Lz02	Puerto Montt	Piedra Azul
Lz02	Puerto Montt	Polincay
Lz02	Puerto Montt	Quillaiepe
Lz02	Puerto Montt	Ralimó
Lz02	Puerto Montt	Río Chico
Lz03	Castro	Coñico
Lz03	Castro	Curahue
Lz03	Castro	Huenuco
Lz03	Castro	La Estancia
Lz03	Castro	Laguna Auquilda
Lz03	Castro	Llaullao
Lz03	Castro	Pastahué
Lz03	Castro	Pidpid
Lz03	Castro	Piriquina
Lz03	Castro	Putemún
Lz03	Castro	Puyán
Lz03	Castro	Puyán Bajo
Lz03	Castro	Quelquel

Zona	Comuna	Localidad	Zona	Comuna	Localidad
Lz03	Castro	Quilquico	Lz05	Frutillar	Colonia La Radio
Lz03	Castro	Rilán	Lz05	Frutillar	Colonia San Martín
Lz03	Castro	Ten Ten	Lz05	Frutillar	El Pescado
Lz03	Castro	Tey	Lz05	Frutillar	Frutillar
Lz03	Castro	Yutuy	Lz05	Frutillar	La Guacha
Lz03	Chonchi	Alcaldeo	Lz05	Frutillar	La Junta
Lz03	Chonchi	Canán1441	Lz05	Frutillar	Loma La Piedra
Lz03	Chonchi	Centenario	Lz05	Frutillar	Los Aromos
Lz03	Chonchi	Huillínco	Lz05	Frutillar	Paraguay
Lz03	Chonchi	Llicaldad	Lz05	Frutillar	Pichilopez
Lz03	Chonchi	Nahuitad	Lz05	Frutillar	Villa Alegre
Lz03	Chonchi	Natri	Lz05	Llanquihue	Colegual Grande
Lz03	Chonchi	Natri Bajo	Lz05	Llanquihue	Colegual San Juan
Lz03	Chonchi	Notuco	Lz05	Llanquihue	Colonia Los Indios
Lz03	Chonchi	Púlpito	Lz05	Llanquihue	La Esperanza
Lz03	Chonchi	Rauco	Lz05	Llanquihue	Loncotoro
Lz03	Chonchi	Tara	Lz05	Llanquihue	Macal
Lz03	Chonchi	Tarahuin	Lz05	Los Muermos	El Laurel
Lz03	Chonchi	Vilupulli	Lz05	Los Muermos	El Torreón
Lz03	Dalcahue	Mocopulli Alto	Lz05	Puerto Octay	Los Maitenes
Lz03	Dalcahue	Mocopulli Bajo	Lz05	Puerto Varas	Los Maitenes
Lz03	Dalcahue	Ñiucho	Lz05	Puerto Varas	Santa María
Lz03	Dalcahue	Pullutauco	Lz05	Purranque	Coihueco
Lz03	Queilen	Apeche	Lz05	Purranque	Colonia Ponce
Lz03	Queilen	Apeche Bajo	Lz05	Purranque	Corte Alto
Lz03	Queilen	Aulen	Lz05	Purranque	Dollínco
Lz03	Queilen	Contuy	Lz05	Purranque	El Palomar
Lz03	Queilen	El Jardín	Lz05	Purranque	Fundo El Bosque
Lz03	Queilen	Paildad	Lz05	Purranque	Fundo Esperanza
Lz03	Queilen	Pilque	Lz05	Purranque	Fundo Las Encinas
Lz03	Queilen	Pureo	Lz05	Purranque	Maipué
Lz03	Queilén	Agoní	Lz05	Purranque	Oromo
Lz03	Quellón	Auchac	Lz05	Purranque	Purranque
Lz03	Quellón	Candelaria	Lz05	Purranque	Rincón Chileno
Lz03	Quellón	Chadmo	Lz05	Río Negro	Ñancuan
Lz03	Quellón	Chaiguao	Lz06	Osorno	Ancolumo
Lz03	Quellón	Coinco	Lz06	Osorno	Cancura
Lz03	Quellón	Coinco Alto	Lz06	Osorno	Curaco
Lz03	Quellón	Compu	Lz06	Osorno	Las Quemadas Altas
Lz03	Quellón	Curanué	Lz06	Osorno	Las Quemadas Bajas Y Central
Lz03	Quellón	Molulco	Lz06	Osorno	Pichidamas
Lz03	Quellón	Punta De Lapas	Lz06	Osorno	Pichil
Lz03	Quellón	Quellón	Lz06	Osorno	Pichilpichil
Lz03	Quellón	Santa Rosa	Lz06	Osorno	Pucoihue
Lz03	Quellón	Tutil	Lz06	Osorno	Tacamó Alto
Lz03	Quellón	Yaldad	Lz06	Osorno	Trocomó
Lz05	Fresia	Fresia	Lz06	Puerto Octay	Administración Rupanco
Lz05	Fresia	La Isla	Lz06	Puerto Octay	Chacay
Lz05	Fresia	Las Beatas	Lz06	Puerto Octay	Cruce Puerto Fonck
Lz05	Frutillar	Balmaceda	Lz06	Puerto Octay	El Carril
Lz05	Frutillar	Cancha Rayada	Lz06	Puerto Octay	El Escudo
Lz05	Frutillar	Casma	Lz06	Puerto Octay	Inca Oriente
Lz05	Frutillar	Centinela La Guacha	Lz06	Puerto Octay	Internacional
Lz05	Frutillar	Colonia Copihue	Lz06	Puerto Octay	La Pataguna

Zona	Comuna	Localidad	Zona	Comuna	Localidad
Lz06	Puerto Octay	La Picada	Lz06	Puyehue	Entre Lagos
Lz06	Puerto Octay	Las Cascadas	Lz06	Puyehue	Futacahuin
Lz06	Puerto Octay	Las Juntas	Lz06	Puyehue	Los Copihues
Lz06	Puerto Octay	Nochaco	Lz06	Puyehue	Los Sauces
Lz06	Puerto Octay	Pellinada	Lz06	Puyehue	Quebrada Honda
Lz06	Puerto Octay	Pichi Río Negro	Lz06	Puyehue	Quema Del Buey
Lz06	Puerto Octay	Piedras Negras	Lz06	Puyehue	Radales
Lz06	Puerto Octay	Puente Alto	Lz06	Río Negro	Buenaventura
Lz06	Puerto Octay	Puerto Clocker	Lz06	Río Negro	Casa De Lata
Lz06	Puerto Octay	Puerto Octay	Lz06	Río Negro	San Florentino
Lz06	Puerto Octay	Río Bonito	Lz07	Futaleufú	El Azul
Lz06	Puyehue	Bahía El Encanto	Lz07	Futaleufú	El Límite
Lz06	Puyehue	Corral Del Sur	Lz07	Futaleufú	Futaleufú
Lz06	Puyehue	Cruce Paisil	Lz07	Futaleufú	Noroeste
Lz06	Puyehue	Cruce Pulelfu	Lz07	Palena	El Malito
Lz06	Puyehue	Desagüe Rupanco	Lz07	Palena	Puerto Ramírez
Lz06	Puyehue	El Encanto	Lz07	Palena	Río Encuentro

El Informe de Ingeniería de Detalle, fue ingresado por, Silica Networks Chile S.A. el 18 de junio y Pacifico Cable S.A el 02 de julio del presente año, ambos informes se encuentran en revisión por parte de la Subsecretaría.

Se estima un Inicio de Servicio para fines del año 2026.

Para más información se puede visitar la página web: <http://www.subtel.gob.cl/ultimamilla-loslagosymagallanes/>

7. HABILITACIÓN DE FIBRA ÓPTICA TARAPACÁ – EN IMPLEMENTACIÓN – SUBSIDIO ASIGNADO \$5.860.580.000.-

El proyecto es una iniciativa conjunta entre la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Gobierno Regional de Tarapacá, cuyo principal objetivo es mejorar la conectividad en localidades rurales de la región. Esta iniciativa se enmarca en la política gubernamental de expansión de infraestructura de telecomunicaciones y reducción de la brecha digital.

La ejecución del proyecto contempla el despliegue de redes de fibra óptica de alta capacidad, lo que permitirá ampliar la cobertura y mejorar la capilaridad de las redes en la región. En particular, se desarrollará un trazado regional de infraestructura óptica que conectará diversas localidades con la capital regional.

Tabla 12 - Localidades FOT

Comuna	Localidad
Alto Hospicio	Alto Hospicio
Camiña	Camiña
Colchane	Colchane
Huara	Zapiga
Huara	Pisagua
Huara	Sibaya
Huara	Huara
Huara	Tarapacá

Comuna	Localidad
Iquique	Chanavayita
Iquique	San Marcos
Iquique	Chipana
Pica	Pica
Pozo Almonte	Pozo Almonte
Pozo Almonte	Lagunas
Pozo Almonte	Mamiña

El proyecto fue adjudicado a Telefónica Empresas S.A. en diciembre de 2021. La adjudicataria ha presentado hechos sobrevinientes a la Subsecretaría de Telecomunicaciones en julio de 2023 y diciembre de 2024, los cuales han sido calificados como tales debido a inconvenientes que han dificultado el cumplimiento de los plazos establecidos. La fecha de Inicio de Servicio está programada para junio de 2026.

Para mayor información se puede visitar la página web: <http://www.subtel.gob.cl/fot2021/>

8. FIBRA ÓPTICA EN COMPLEJOS FRONTERIZOS – ZONA GEOGRÁFICA SUR – EN OPERACIÓN – SUBSIDIO ASIGNADO \$3.969.712.250.-

Este proyecto tiene por objetivo la instalación, operación y explotación de infraestructura óptica de telecomunicaciones para mejorar la cobertura en centros estratégicos de tránsito dentro del país. A través de este proyecto, los Complejos y Pasos Fronterizos Terrestres, junto a localidades ubicadas en el trayecto de los trazados proyectados de fibra óptica, podrían acceder a redes de infraestructura física en operación o despliegue, derivada de concursos públicos previos desarrollados por el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

En agosto de 2021 se adjudicó la Zona Geográfica Sur a la empresa Telefónica del Sur S.A., con un subsidio total de \$3.969.712.250.-

El proyecto adjudicado fue autorizado mediante una concesión de servicio intermedio de telecomunicaciones, destinada exclusivamente a proveer infraestructura física para telecomunicaciones. En virtud de esta adjudicación, Telefónica del Sur S.A. implementó 4 tramos independientes de infraestructura óptica en zonas fronterizas, cuya denominación y alcance geográfico se detallan a continuación:

Tabla 13 – Adjudicación ZG Sur

Proyecto	Pasos Fronterizos Beneficiados	Subsidio Asignado
Fibra Óptica En Complejos Fronterizos Zona Geográfica Sur	Carirriñe (1POIIT) Futaleufú (2POIIT) Río Encuentro (2 POIIT + 2 Ad) Integración Austral (2 POIIT)	\$ 3.969.712.250

Para mayor información se puede visitar la página web: <http://www.subtel.gob.cl/focf2020/>

9. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA ZONAS WIFI 2.0 – EN OPERACIÓN – SUBSIDIO ASIGNADO \$3.459.154.340.-

El proyecto busca mejorar y expandir la infraestructura de acceso público a Internet, manteniendo los elementos esenciales de su versión anterior, pero optimizando la calidad del servicio para responder mejor a las necesidades actuales de los usuarios. Esta iniciativa fomenta el uso eficiente de la tecnología y garantiza la sostenibilidad financiera a largo plazo.

Para ello, se implementó un subsidio inicial enfocado en la inversión, el cual debe ser complementado con un modelo de negocio que permita cubrir los costos operativos una vez finalizado el apoyo financiero otorgado por Subtel.

El proceso se dividió en dos llamados a concurso:

1. Primer llamado: Desde la región de Arica y Parinacota hasta la región del Libertador General Bernardo O'Higgins (una parcialidad).
2. Segundo llamado: Desde la región del Libertador General Bernardo O'Higgins hasta la región de Magallanes y la Antártica Chilena, incluyendo a la región Metropolitana.

El primer período de postulación ya ha finalizado su período de obligatoriedad, el cual se detalla en la siguiente tabla, correspondiente a 110 Zonas WiFi, de las cuales, 72 cumplieron su período de obligatoriedad y 38 se encuentran con servicio operativo, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 14 – Zonas WiFi primer llamado

Área De Postulación	Adjudicataria	Total Zonas	
		Etapas 1	Etapas 2
Tarapacá Costa	Telecable E.I.R.L.	12	20
		POEB cumplido	POEB cumplido
Coquimbo Sur	Chile TV Cable S.A.	15	25
		POEB cumplido	POEB cumplido
Valparaíso Cordillera	Comunicaciones Salto Del Soldado Ltda.	15	23
		Operativas	Operativas
Total		42	68

En abril de 2021 se adjudicaron 398 nuevas zonas en un segundo llamado a concurso, de las cuales 36 cumplieron el periodo de obligatoriedad y 362 se encuentran con servicio operativo, de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 15 – Zonas WiFi segundo llamado

Área De Postulación	Adjudicataria	Total Zonas	
		Etapas 1	Etapas 2
Tarapacá Cordillera	Telecable E.I.R.L.	14	21
Antofagasta		POEB cumplido	Operativas
Arica Y Parinacota Sur		4	8
Arica Y Parinacota Norte		POEB cumplido	POEB cumplido
Valparaíso Centro	Netland Chile S.A.	10	16
		POEB cumplido	Operativas
		9	15
		Operativas	Operativas
		12	21

Área De Postulación	Adjudicataria	Total Zonas	
		Etapas 1	Etapas 2
		Operativas	Operativas
Metropolitana Provincia Cordillera		9 Operativas	14 Operativas
Libertador General Bernardo O'Higgins Norte Cordillera		14 Operativas	23 Operativas
Libertador General Bernardo O'Higgins Norte Costa		18 Operativas	27 Operativas
Libertador General Bernardo O'Higgins Sur Cordillera		15 Operativas	27 Operativas
Libertador General Bernardo O'Higgins Sur Costa		15 Operativas	26 Operativas
Maule Norte	Luzlinares S.A.	17 Operativas	32 Operativas
Maule Sur	Luzparral S.A.	11 Operativas	20 Operativas
Total		148	250

Para mayor información se puede visitar la página web: <http://www.subtel.gob.cl/wifi2/>

10. FIBRA ÓPTICA NACIONAL – EN IMPLEMENTACIÓN / INICIO DE SERVICIO – SUBSIDIO ASIGNADO \$75.093.899.822.-

El proyecto tiene como objetivo establecer una red terrestre de fibra óptica que conecte las capitales comunales con sus respectivas capitales regionales, fortaleciendo la infraestructura digital del país y promoviendo su desarrollo integral. Esta red garantizará un acceso abierto y no discriminatorio, permitiendo a los concesionarios de telecomunicaciones utilizarla para ampliar la cobertura y la calidad de los servicios.

Gracias a esta infraestructura, se brindará el soporte tecnológico necesario para impulsar el desarrollo socio-productivo, mejorar la calidad de vida de la población y enfrentar los desafíos de la transformación digital.

Se habilitará el acceso abierto a esta red de transporte, fomentando una mayor competencia en el mercado y promoviendo la integración digital en comunas y localidades de todo el país. De esta manera, el proyecto contribuirá al crecimiento social y productivo de las regiones, tal como se ilustra en el siguiente diagrama:

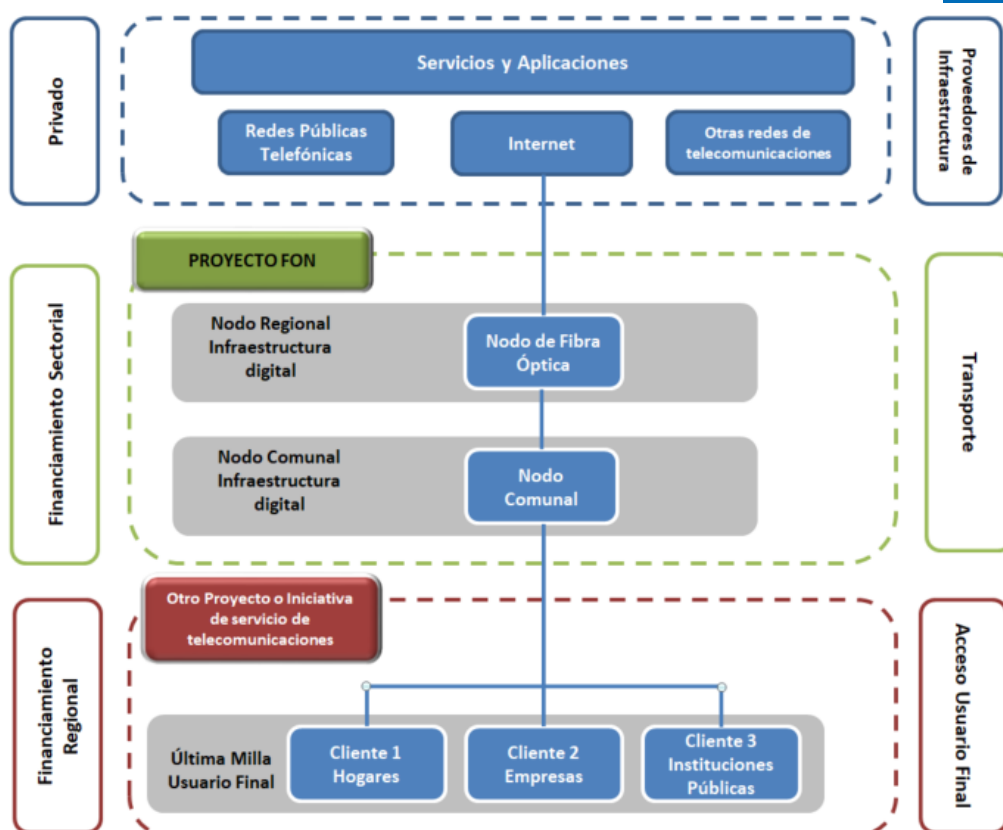


Ilustración 1 – Diagrama FON

El proyecto no sólo busca conectar las capitales comunales y regionales, sino que también mejorar significativamente la resiliencia de la infraestructura actual del país. Al establecer trazados de fibra óptica en rutas alternativas, se fortalecerá la capacidad de respuesta ante emergencias y eventos críticos, reduciendo vulnerabilidades en la red de telecomunicaciones.

Para generar un mayor interés en la industria, el proyecto se dividió en 6 Macrozonas, cada una de las cuales cuenta con un único adjudicatario responsable de la construcción, operación y explotación de las redes de fibra ópticas en las regiones y comunas correspondientes a cada Macrozona.

Actualmente, el operador de telecomunicaciones Claro Chile SpA. ha celebrado con WOM S.A., un contrato para el uso de la infraestructura desplegada en la Macrozona Centro Norte, contratando un canal óptico en el Trazado Regional de Valparaíso y uno en la región Metropolitana.

Tabla 16 – Macrozonas, km y adjudicatario FON

Macrozona Arica Y Parinacota	Macrozona Norte	Macrozona Centro Norte	Macrozona Centro	Macrozona Centro Sur	Macrozona Sur
Arica y Parinacota	Antofagasta y Atacama	Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana	Libertador General Bernardo O'Higgins y Maule	Ñuble y Biobío	Araucanía, Los Ríos y Los Lagos
766 Km De Fibra Óptica	1.916 Km De Fibra Óptica	1.968 Km De Fibra Óptica	1.422 Km De Fibra Óptica	1.438 Km De Fibra Óptica	2.520 Km De Fibra Óptica

Macrozona Arica Y Parinacota	Macrozona Norte	Macrozona Centro Norte	Macrozona Centro	Macrozona Centro Sur	Macrozona Sur
WOM S.A.	WOM S.A.	WOM S.A.	WOM S.A.	WOM S.A.	Telefónica Empresas S.A.

Tabla 17 – Detalle comunas FON

Macrozona	Subsidio	Región	Cantidad Comunas	Comunas FON	Fecha Inicio de Servicio
Arica y Parinacota	\$6.280.391.282	Arica y Parinacota	4	Arica, Camarones, General Lagos, Putre.	29-01-2025
Norte	\$14.518.154.271	Antofagasta	9	Calama, María Elena, Mejillones, Ollagüe, San Pedro De Atacama, Sierra Gorda, Taltal, Tocopilla. Adicional: Antofagasta (POIIT En Caleta Coloso Y Paranal)	09-06-2025
		Atacama	8	Alto Del Carmen, Caldera, Chañaral, Diego De Almagro, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla, Vallenar.	
Centro Norte	\$8.818.686.407	Coquimbo	13	Andacollo, Canela, Combarbalá, Illapel, La Higuera, Monte Patria, Ovalle, Paiguano, Punitaqui, Río Hurtado, Salamanca, Vicuña. Adicional: Los Vilos (POIIT Los Vilos Y Caimanes)	14-12-2023
		Valparaíso	20	Algarrobo, Cabildo, Calle Larga, Cartagena, Catemu, El Quisco, El Tabo, Hijuelas, La Ligua, Olmué, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quintero, Rinconada, San Esteban, Santa María, Zapallar. Adicional: Santo Domingo (POIIT Santo Domingo)	
		Metropolitana de Santiago	13	Alhué, Calera De Tango, Curacaví, El Monte, Isla De Maipo, María Pinto, Padre Hurtado, Pirque, San José De Maipo, San Pedro. Adicional: Lampa (POIIT Batuco Y Lampa), Tiltit (POIIT Tiltit) Y Melipilla (POIIT Melipilla)	
Centro	\$11.755.037.031	Libertador General Bernardo O'Higgins	26	Chépica, Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, La Estrella, Las Cabras, Litueche, Lolol, Malloa, Marchihue, Nancagua, Navidad, Olivar, Palmilla, Paredones, Peralillo, Peumo, Pichidegua, Pichilemu, Placilla, Pumanque, Quinta De Tilcoco, San Vicente, Santa Cruz. Adicional: Chimbarongo (POIIT Chimbarongo)	14-09-2023
		Maule	22	Cauquenes, Chanco, Colbún, Constitución, Curepto, Empedrado, Hualañé, Licantén, Molina, Pelarco,	

Macrozona	Subsidio	Región	Cantidad Comunas	Comunas FON	Fecha Inicio de Servicio
				Pelluhue, Pencahue, Rauco, Río Claro, Romeral, Sagrada Familia, San Clemente, San Javier, Vichuquén, Villa Alegre, Yervas Buenas. Adicional: Teno (POIIT Teno)	
Centro Sur	\$11.106.265.700	Biobío	21	Alto Biobío, Antuco, Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Florida, Lebu, Los Alamos, Lota, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Barbara, Santa Juana, Tirúa, Tucapel, Yumbel. Adicional: Mulchén (POIIT Mulchén)	17-05-2024
		Ñuble	17	Cobquecura, Coelemu, Coihueco, El Carmen, Ninhue, Pemuco, Pinto, Portezuelo, Quillón, Quirihue, Ránquil, San Fabián, San Ignacio, San Nicolás, Treguaco, Yungay. Adicional: Ñiquén (POIIT Ñiquén).	
Sur	\$22.615.365.131	Araucanía	24	Carahue, Cunco, Curarrehue, Galvarino, Lautaro, Melipeuco, Nueva Imperial, Temuco, Perquenco, Pucón, Saavedra, Teodoro Schmidt, Toltén, Vilcún, Villarrica, Cholchol, Angol, Curacautín, Lonquimay, Los Sauces, Lumaco, Purén, Renaico y Traiguén	2do. Semestre 2025 *Solicitud de Hecho Sobreviniente
		Los Ríos	10	Valdivia, Corral, Mariquina, Panguipulli, Futrono, Lago Ranco y Río Bueno. Adicional: Máfil, Lanco y Los Lagos	
		Los Lagos	17	Calbuco, Fresia, Los Muermos, Maullín, Curaco De Vélez, Puqueldón, Quinchao, Chaitén, Puerto Octay, Río Negro, San Juan De La Costa y San Pablo. Adicional: Puyehue, Quemchi, Chonchi, Dalchaue y Queilén	
Total	75.093.899.822		204		

*De ser autorizada la solicitud, se ampliaría el plazo de Inicio de Servicio

Para mayor información se pueden visitar las páginas web: <http://www.subtel.gob.cl/fon2019/> y <http://www.subtel.gob.cl/fon-sur2020/>

11. FIBRA ÓPTICA AUSTRAL – TRONCAL SUBMARINA AUSTRAL Y TERRESTRE DE MAGALLANES – EN OPERACIÓN – SUBSIDIO ASIGNADO \$57.580.830.931.-

El objetivo de esta iniciativa es desplegar la infraestructura necesaria para la implementación de las Troncales de Infraestructura Óptica en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Dicha infraestructura corresponde a un tendido submarino y tres tendidos terrestres de cables de fibra

óptica, con diferentes Puntos de Operación e Interconexión de Infraestructura Óptica de Telecomunicaciones (POIIT) los cuales permitirán el acceso abierto y no discriminatorio a dicha infraestructura en la zona más austral del país.

Estas troncales permitirán soportar todos los servicios de telecomunicaciones existentes en la zona e incorporar nuevos servicios de alta capacidad, de acceso y aplicaciones para usuarios finales.

Como resultado del Concurso Público realizado en 2017, se adjudicaron las siguientes propuestas:

- Troncal Submarina Austral: adjudicada a Comunicación y Telefonía Rural S.A. (CTR S.A.).
- Troncal Terrestre Magallanes: adjudicada a Conductividad Austral Ltda.

El subsidio total asignado a ambas empresas asciende a \$57.580.830.931, distribuidos de la siguiente manera:

- \$4.888.861.034 para la Troncal Terrestre Magallanes.
- \$52.691.969.897 para la Troncal Submarina Austral.

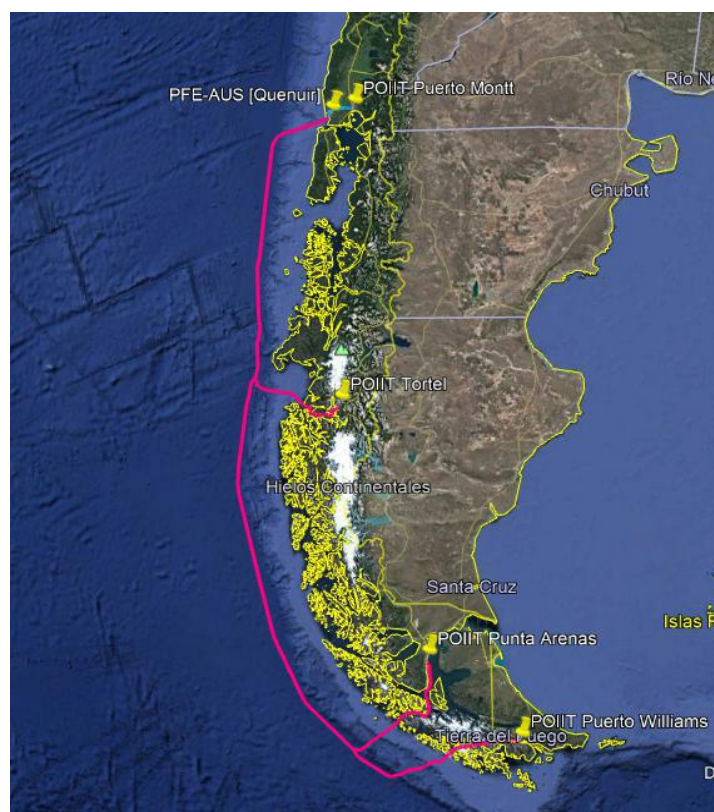


Ilustración 2 - Troncal Submarina FOA

CTR S.A. instaló 2.870 km de cable submarino, 27 repetidores ópticos submarinos y dos unidades de derivación. Por otra parte, con el objetivo de prestar este servicio con las especificaciones técnicas requeridas por SUBTEL, la Beneficiaria instaló una Estación de Amplificación (también denominada OLA Station) en la localidad de Quenuir (Región de Los Lagos), además de aproximadamente 100 km

de cable terrestre soterrado entre las cámaras de amarre del cable submarino (BMH) y los POIIT Submarinos comprometidos en las localidades antes señaladas.

Tabla 78 - Ilustración de los POIIT Submarinos - Troncal Submarina FOA

Código POIIT Submarino	Nombre POIIT Submarino	Región	Comuna	Localidad
POIIT-S-Aus-001	Puerto Williams	Magallanes	Cabo De Hornos	Puerto Williams
POIIT-S-Aus-002	Punta Arenas	Magallanes	Punta Arenas	Punta Arenas
POIIT-S-Aus-003	Tortel	Aysén	Tortel	Caleta Tortel
POIIT-S-Aus-004	Puerto Montt	Los Lagos	Puerto Montt	Puerto Montt

El servicio está actualmente operativo y el Periodo de Obligatoriedad de las exigencias establecidas en las bases del concurso se extenderá hasta el 23 de diciembre de 2039.

A la fecha de elaboración del presente informe, los operadores de telecomunicaciones Entel S.A., Claro Chile S.A., Telefónica Chile S.A., GTD y WOM han celebrado contratos con CTR S.A., según el siguiente detalle:

- Entel S.A. contrató un Canal Óptico Submarino con capacidad equivalente a OTU2 (10 [Gbps]), utilizando la totalidad de los POIIT Submarinos.
- Claro Chile S.A. contrató un Canal Óptico Submarino con capacidad equivalente a OTU4 (100 [Gbps]), utilizando —hasta el momento— los POIIT Submarinos de Punta Arenas y de Puerto Montt.
- Telefónica Chile S.A. contrató un Canal Óptico Submarino con capacidad equivalente a OTU4 (100 [Gbps]), con el que utilizarán los POIIT Submarinos de Puerto Williams, de Punta Arenas y de Puerto Montt, en principio.
- GTD contrató un Canal Óptico Submarino con capacidad equivalente a OTU2 (10 [Gbps]), con el que utilizarán los POIIT Submarinos de Punta Arenas y de Puerto Montt, en principio.
- Comunicación y Telefonía Rural S.A. contrató un Canal Óptico Submarino con capacidad equivalente a OTU1 (2,5 [Gbps]), con el que utilizarán los POIIT Submarinos de Puerto Williams, Punta Arenas y de Puerto Montt, en principio.
- WOM S.A. contrató un Canal Óptico Submarino con capacidad equivalente a OTU1 (2,5 [Gbps]), utilizando la totalidad de los POIIT Submarinos.

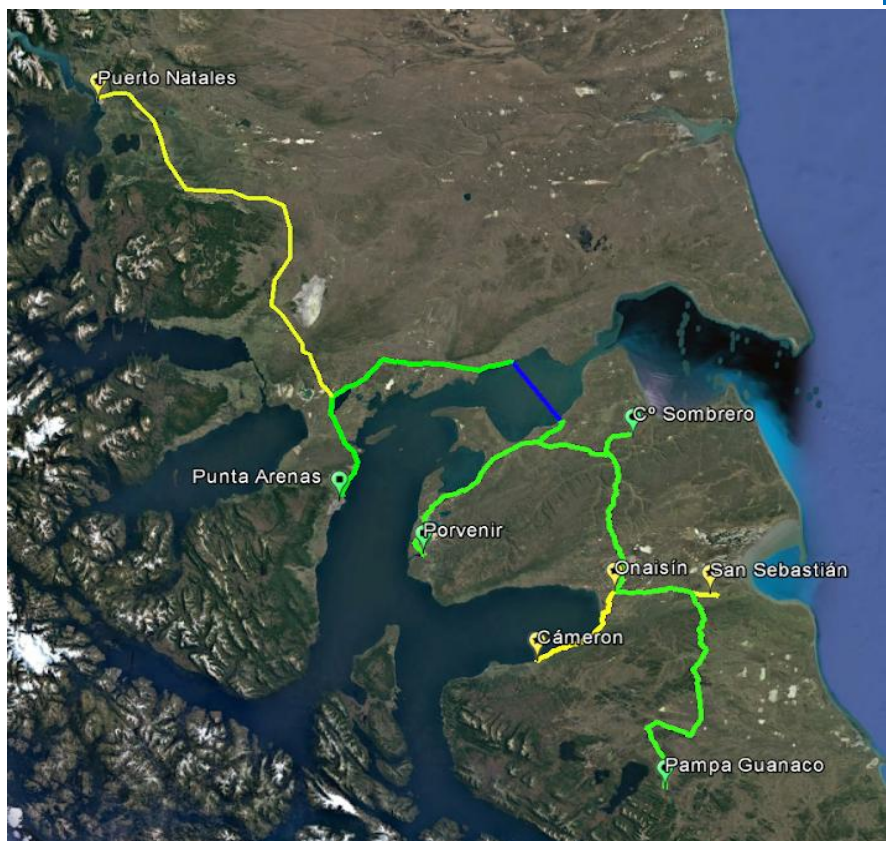


Ilustración 3 - Trazado FOA Magallanes - Conductividad Austral Ltda

La solución técnica implementada por la Beneficiaria Conductividad Austral Ltda. para el Proyecto Troncal Terrestre Magallanes contempla la instalación de la totalidad de los Puntos de Operación e Interconexión de Infraestructura Óptica de Telecomunicaciones (POIIT) Terrestres definidos en las Bases de Concurso; esto es, en las localidades de Punta Arenas, Porvenir, Cerro Sombrero, Pampa Guanaco, Puerto Natales, Onaisín, Cámara y San Sebastián.

Asimismo, para la conexión de dichos POIIT Terrestres, se desplegaron más de 730 km de cable de fibra óptica, distribuidos de la siguiente manera:

- 730 [km] soterrados sobre la faja fiscal de las rutas de la región.
- 38 [km] de cable aéreo.
- 34 [km] de cable submarino para cruzar el Estrecho de Magallanes, conectando los despliegues de la parte continental de la región con la isla de Tierra del Fuego.

Tabla 19 - Ubicación de los POIIT Terrestres Troncal Magallanes FOA

Código POIIT Terrestre	Nombre POIIT Terrestre	Región	Comuna	Localidad
POIIT-T-Mag-001	Punta Arenas	Magallanes	Punta Arenas	Punta Arenas
POIIT-T-Mag-002	Porvenir	Magallanes	Porvenir	Porvenir
POIIT-T-Mag-003	Pampa Guanaco	Magallanes	Timaukel	Pampa Guanaco
POIIT-T-Mag-004	Cerro Sombrero	Magallanes	Primavera	Cerro Sombrero

Código POIIT Terrestre	Nombre POIIT Terrestre	Región	Comuna	Localidad
POIIT-T-Mag-005	Onaisín	Magallanes	Porvenir	Onaisín
POIIT-T-Mag-006	Cameron	Magallanes	Timaukel	Cameron
POIIT-T-Mag-007	San Sebastián	Magallanes	Porvenir	San Sebastián
POIIT-T-Mag-008	Puerto Natales	Magallanes	Natales	Puerto Natales

El servicio está actualmente operativo y el Periodo de Obligatoriedad de las exigencias establecidas en las bases del concurso estará vigente hasta el 31 de enero de 2040. A la fecha de elaboración del presente informe, los operadores de telecomunicaciones Claro Chile S.A., Telefónica Chile S.A. y WOM S.A han celebrado contratos con Conductividad Austral Ltda., según el siguiente detalle:

- Claro Chile S.A. contrató dos Canales Ópticos Terrestres, utilizando el TRIOT Terrestres entre Punta Arenas y Cerro Sombrero, en principio.
- Telefónica Chile S.A. contrató un Canal Óptico Terrestre, utilizando los TRIOT Terrestres entre Punta Arenas y Cerro Sombrero, entre Cerro Sombrero y Porvenir, y entre Punta Arenas y Puerto Natales, en principio.
- WOM S.A. contrató un Canal Óptico Terrestre, utilizando los TRIOT Terrestres entre Punta Arenas y Cerro Sombrero, entre Cerro Sombrero y Porvenir, y entre Punta Arenas y Puerto Natales, en principio.

Para mayor información se pueden visitar la página web: <http://www.subtel.gob.cl/foa2017/>

12. FIBRA ÓPTICA AUSTRAL – TRONCALES TERRESTRES AYSÉN Y LOS LAGOS – EN OPERACIÓN – SUBSIDIO ASIGNADO \$6.138.074.796.-

Tras la adjudicación parcial del Concurso Público “Fibra Óptica Austral” (Código: FDT-2017-01), el Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones autorizó la convocatoria de un nuevo concurso público para las troncales terrestres no adjudicadas en la fase anterior, específicamente los proyectos Troncal Terrestre Aysén y Troncal Terrestre Los Lagos.

Como resultado de este nuevo Concurso Público, denominado “Fibra Óptica Austral”, Troncales Terrestres Aysén y Los Lagos, Código: FDT-2018-02, fueron adjudicadas en el año 2019 las propuestas para los Proyectos objeto del Concurso a la empresa Silica Networks Chile S.A., asignándose los subsidios que se indican a continuación.

Tabla 20 - Montos de subsidio asignados a la empresa Silica Networks S.A.

Código Proyecto	Troncal De Infraestructura Óptica	Subsidio Asignado
FDT-2017-01-2-Ays	Troncal Terrestre Aysén	\$4.317.990.056.-
FDT-2017-01-2-Lag	Troncal Terrestre Los Lagos	\$1.820.084.740.-

El Proyecto Troncal Terrestre Aysén contempla 14 POIIT Terrestres emplazados en las localidades que se indican en la tabla siguiente, junto con el despliegue de más de 617 km de cable de fibra óptica

para la implementación de los TRIOT Terrestres que interconectan a dichos POIIT Terrestres, los cuales fueron instalados con tendidos aéreos y soterrados, principalmente, en la faja fiscal de los caminos públicos de la región, además de instalarse tendidos subacuáticos en el Lago General Carrera.



Ilustración 4 - Trazado Troncal Terrestre Aysén FOA

Tabla 21 - Ubicación de los POIIT Terrestres - Troncal Aysén FOA

Región	Provincia	Comuna	Localidad
Aysén	Capitán Prat	Tortel	Caleta Tortel
Aysén	Capitán Prat	Cochrane	Los Nadis
Aysén	Capitán Prat	Cochrane	Cochrane
Aysén	General Carrera	Chile Chico	Puerto Bertrand
Aysén	General Carrera	Chile Chico	Puerto Guadal
Aysén	General Carrera	Chile Chico	Mallín Grande
Aysén	General Carrera	Chile Chico	Chile Chico
Aysén	General Carrera	Río Ibáñez	Puerto Río Tranquilo
Aysén	General Carrera	Río Ibáñez	Bahía Murta
Aysén	General Carrera	Río Ibáñez	Cerro Castillo
Aysén	General Carrera	Río Ibáñez	Puerto Ing. Ibáñez
Aysén	Coyhaique	Coyhaique	El Blanco
Aysén	Coyhaique	Coyhaique	Coyhaique
Aysén	Coyhaique	Coyhaique	Balmaceda

El 04 de noviembre de 2021, esta Subsecretaría autorizó las obras e instalaciones del Proyecto Troncal Terrestre Aysén, marcando el inicio de la etapa de operación.

El Periodo de Obligatoriedad de las exigencias establecidas en las bases (POEB) del concurso estará vigente hasta el 04 de noviembre de 2041. A la fecha de este informe, se detallan los avances, los operadores de telecomunicaciones, Compañía Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur S.A. y WOM S.A. han celebrado con Silica Networks Chile S.A. un contrato para el uso de la infraestructura desplegada, según el siguiente detalle:

- Telsur S.A. contrató un Canal Óptico Terrestre, utilizando los TRIOT POIIT Terrestres emplazados en las localidades de Cochrane, Puerto Bertrand, Puerto Guadal, Puerto Río Tranquilo, Bahía Murta, Mallín Grande, Chile Chico, Puerto Ingeniero Ibáñez, Cerro Castillo, Balmaceda, el Blanco y Coyhaique.
- WOM S.A. contrató un Canal Óptico Terrestre, utilizando todos los POIIT Terrestres del Proyecto.
- ENTEL contrató un Canal Óptico Terrestre, utilizando todos los POIIT Terrestres del Proyecto.

En relación al Proyecto Troncal Terrestre Los Lagos, cabe hacer presente que este contempló la instalación de 11 POIIT Terrestres emplazados en las localidades que se indican en la tabla siguiente y el despliegue de más de 247 km de cable de fibra óptica para la implementación de los TRIOT Terrestres que interconectan a dichos POIIT Terrestres. Estos fueron instalados con tendidos aéreos y soterrados, principalmente, en la faja fiscal de los caminos públicos de la región.

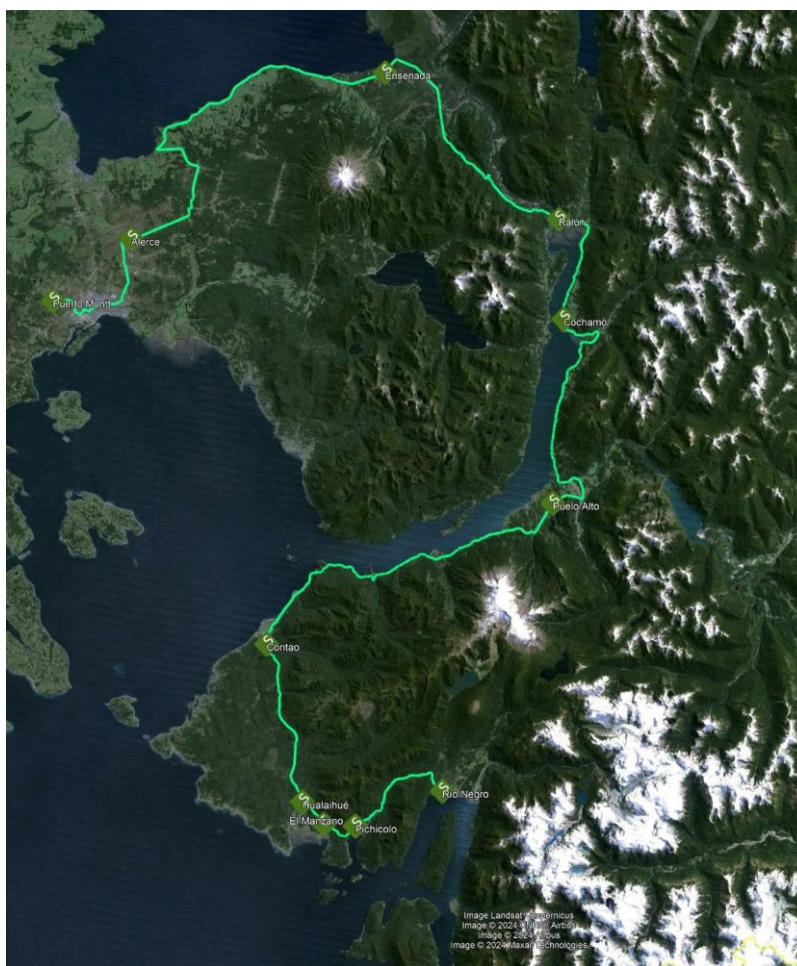


Ilustración 5 - Trazado Troncal Terrestre Los Lagos FOA

Tabla 22 - Ubicación POIIT Terrestres Troncal Los Lagos FOA

Región	Provincia	Comuna	Localidad
Los Lagos	Llanquihue	Puerto Montt	Puerto Montt
Los Lagos	Llanquihue	Puerto Montt	Alerce
Los Lagos	Llanquihue	Puerto Varas	Ensenada
Los Lagos	Llanquihue	Puerto Varas	Ralún
Los Lagos	Llanquihue	Cochamó	Cochamó
Los Lagos	Llanquihue	Cochamó	Puelo Alto
Los Lagos	Palena	Hualaihué	Contao
Los Lagos	Palena	Hualaihué	El Manzano
Los Lagos	Palena	Hualaihué	Pichicolo
Los Lagos	Palena	Hualaihué	Rio Negro
Los Lagos	Palena	Hualaihué	Hualaihué

Con fecha 07 de marzo de 2022, esta Subsecretaría autorizó las obras e instalación de la Troncal Terrestre Los Lagos, con lo cual se dio inicio a la etapa de operación de la misma. El Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases para este Proyecto estará vigente hasta el 07 de marzo de 2042. Actualmente, los operadores de telecomunicaciones WOM S.A. y Patagonia IP SpA han celebrado con Silica Networks Chile S.A., un contrato para el uso de la infraestructura desplegada, según el siguiente detalle:

- WOM S.A. contrató un Canal Óptico Terrestre, utilizando todos los POIIT Terrestres del Proyecto.
- Patagonia IP SpA contrató un Canal Óptico Terrestre, utilizando los POIIT Terrestres emplazados en las localidades de Ensenada, Ralún, Cochamó, Puelo Alto, Contao, Hualaihué, El Manzano, Pichicolo y Río Negro.

Para mayor información se pueden visitar la página web: <http://www.subtel.gob.cl/foaustral2018/>

PROYECTOS DE ÚLTIMA MILLA – COORDINACIÓN REGIONAL

Estos proyectos son iniciativas desarrolladas en conjunto con los Gobiernos Regionales con el objetivo de identificar y priorizar las necesidades de telecomunicaciones en los distintos territorios.

A través de estudios de factibilidad técnica y económica, se busca levantar y priorizar localidades para ofrecer soluciones en telecomunicaciones.

A continuación, se presenta la tabla resumen del estado a nivel nacional:

Tabla 23 - Estado Proyectos ÚM

Región	Localidades	Costo	Solución	Estado
Arica y Parinacota	9	\$9.357.785.533	Infraestructura Y Voz - Datos Móviles	Evaluación del GORE
Tarapacá	38	\$8.345.938.876	Infraestructura Y Voz - Datos Móviles	Revisión del convenio por parte de división jurídica del GORE

Región	Localidades	Costo	Solución	Estado
Antofagasta	Re-Diseño	Re-Diseño	Re-Diseño	En proceso de reformulación
Atacama	37	\$7.420.736.000	Infraestructura Y Voz - Datos Móviles	Concurso Publicado
Coquimbo	26	\$6.448.888.000	Infraestructura E Internet Hogar	En proceso de elaboración de bases específicas de concurso
Valparaíso	152	\$14.223.706.592 \$5.445.606.067	Voz - Datos Móviles	Sin aprobación GORE
Metropolitana	116	\$14.045.380.849	Internet Hogar	Sin aprobación GORE
O'Higgins	Re-Diseño	Re-Diseño	Re-Diseño	En revisión por parte del GORE (presupuesto)
Maule	156	\$11.775.088.406	Infraestructura E Internet Hogar	En revisión por parte del GORE (presupuesto)
Ñuble	54	\$7.604.612.847	Infraestructura E Internet Hogar	En etapa de evaluación de propuestas
Biobío	112	\$15.585.151.798	Voz - Datos Móviles	GORE decidió no avanzar con convenio de transferencia
Araucanía	69	\$14.487.313.189	Infraestructura Y Voz - Datos Móviles	En proceso de elaboración de bases específicas de concurso.
Los Ríos	78	\$8.271.113.453	Infraestructura Y Voz - Datos Móviles	Revisión del convenio por parte de división jurídica del GORE
Los Lagos (1er Llamado)	172	\$ 5.744.203.578	Internet Hogar	En implementación
Los Lagos (2do Llamado)	199	\$ 9.235.796.422	Internet Hogar	En proceso de elaboración de bases específicas de concurso.
Aysén	21	\$ 8.018.052.422	Internet Hogar	En proceso de elaboración de bases específicas de concurso.
Magallanes	Re-Diseño	Re-Diseño	Re-Diseño	En proceso de reformulación

CONTRAPRESTACIONES LICITACIONES DE ESPECTRO

1. CONCURSO 2,6 GHZ – EN OPERACIÓN

A través del llamado a concurso público para asignar concesiones de servicios públicos de transmisión de datos fijo y/o telefonía móvil en la banda de frecuencia 2,6 GHz, se exigió como contraprestación otorgar oferta de conectividad a 543 localidades aisladas a lo largo del país, con servicio de transmisión de datos.

Como resultado de esta iniciativa, se asignaron los bloques de frecuencia A, B y C, las empresas Claro Chile S.A., Will S.A. y Telefónica Móviles Chile S.A., respectivamente, asignando 181 localidades obligatorias a cada concesionaria. Las adjudicatarias iniciaron servicio de transmisión en marzo de 2015.

Cabe tener en consideración que las adjudicatarias accedieron a un compromiso adicional -no obligatorio- para implementar servicios de telefonía móvil en las localidades obligatorias, donde sólo exigía servicio de transmisión de datos.

La cantidad de localidades beneficiadas por región son las siguientes:

Tabla 24 - Localidades beneficiadas Contraprestaciones 2,6 GHz

Región	Cantidad Localidades	Región	Cantidad Localidades
Arica y Parinacota	4	Biobío	130
Tarapacá	10	Ñuble	56
Antofagasta	-	Araucanía	56
Atacama	4	Los Lagos	95
Coquimbo	43	Los Ríos	20
Valparaíso	16	Aysén	11
Metropolitana	5	Magallanes	6
O'Higgins	36	Total	543
Maule	51		

2. CONCURSO 700 MHZ – EN OPERACIÓN

En octubre de 2013, durante el concurso público de servicios de Internet móvil en la banda 700 MHz, esta Subsecretaría incorporó la obligación a las empresas adjudicatarias el otorgar oferta de servicios de telefonía móvil y transmisión de datos con acceso a Internet a 1.281 localidades a nivel nacional y dar conectividad a 13 rutas obligatorias, las cuales suman más de 850 kilómetros.

En febrero de 2014 se realizó la adjudicación de los bloques de espectro A, B y C a las empresas Telefónica Móviles Chile S.A., Will S.A. y Claro Servicios Empresariales S.A., respectivamente. En el mes de agosto de 2015, la Contraloría General de la República tomó razón de los decretos de concesión. Las adjudicatarias iniciaron servicio en marzo de 2017.

El detalle de beneficios por región es el siguiente:

Tabla 25 - Detalle beneficios Contraprestaciones 700 MHz

Región	Localidades Beneficiadas	EES Beneficiados	Rutas Beneficiadas
Arica y Parinacota	36	9	1
Tarapacá	33	11	-
Antofagasta	15	-	4
Atacama	54	7	-
Coquimbo	125	63	-
Valparaíso	16	5	-
Metropolitana	23	9	-
O'Higgins	39	13	-
Maule	112	23	-
Biobío	98	51	-
Ñuble	50	26	-
Araucanía	214	108	8
Los Lagos	251	114	-
Los Ríos	128	60	-
Aysén	55	3	-
Magallanes	32	1	-
Total	1.281	503	13

3. CONTRAPRESTACIONES SOCIALES 5G – 700 MHZ – EN IMPLEMENTACIÓN

El año 2020 Subtel desarrolló un proceso de asignación de espectro radioeléctrico destinado al despliegue comercial de servicios de telecomunicaciones 5G en las bandas de frecuencia 700 MHz, 3,5 GHz, AWS y 26 GHz.

Con el fin de disminuir la brecha digital, se consideró dentro de las obligaciones del concurso correspondiente a la banda 700 MHz, proveer de conectividad a 366 localidades aisladas o con bajo interés por parte de los operadores, debido al poco atractivo comercial que tienen. En este sentido, se realizó un trabajo en conjunto con las municipalidades de todo el país para seleccionar las localidades. Dicho concurso fue asignado a la empresa WOM S.A., cuyo decreto fue publicado en octubre de 2021.

La implementación de estas localidades tuvo un máximo de 18 meses a partir de la publicación del Decreto en el Diario Oficial, es decir, el plazo máximo correspondía al 7 de abril de 2023. Sin embargo, a la fecha, la concesionaria no ha finalizado el despliegue de las estaciones base.

El detalle de beneficios por región es:

Tabla 26- Distribución Contraprestaciones Sociales por región

Regiones	Comunas	Localidades
Región de Arica y Parinacota	4	4
Región de Tarapacá	5	6
Región de Antofagasta	4	4
Región de Atacama	7	8
Región de Coquimbo	7	11
Región de Valparaíso	23	24
Región Metropolitana	15	22
Región Libertador Bernardo O'Higgins	22	28
Región del Maule	28	38
Región de Ñuble	28	36
Región del Biobío	24	37
Región de la Araucanía	29	58
Región de Los Ríos	10	12
Región de Los Lagos	30	46
Región de Aysén	10	11
Región De Magallanes y La Antártica Chilena	11	12
Total	254	366

El detalle de las localidades obligatorias autorizadas con inicio de servicio, a la fecha, es el siguiente:

Tabla 27 - Estado de Avance Contraprestaciones Sociales

LLOO	ESTADO FINAL	Nombre	Comuna	Región
LLOO-1	Autoriza	Pacífico Norte	Tocopilla	Antofagasta
LLOO-4	Autoriza	Caquena	Putre	Arica y Parinacota
LLOO-5	Autoriza	Playas El pulpo, Ramada, Rodillo, Caleta los patos	Caldera	Atacama

Subsecretaría de Telecomunicaciones
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones



LLOO	ESTADO FINAL	Nombre	Comuna	Región
LLOO-221	Autoriza	Pajal	Antuco	Bíobío
LLOO-215	Autoriza	Los Puentes	Arauco	Bíobío
LLOO-219	Autoriza	Los Caulles	Cabrero	Bíobío
LLOO-224	Autoriza	Cuyimpalihue	Cañete	Bíobío
LLOO-232	Autoriza	Puente 3	Concepción	Bíobío
LLOO-205	Autoriza	Puente 7	Florida	Bíobío
LLOO-223	Autoriza	Chorrillos	Laja	Bíobío
LLOO-234	Autoriza	Cuyinco Bajo	Los Álamos	Bíobío
LLOO-201	Autoriza	El Arrayan - Las Violetas	Los Ángeles	Bíobío
LLOO-204	Autoriza	Santa Laura	Los Ángeles	Bíobío
LLOO-206	Autoriza	Paso de Arena	Los Ángeles	Bíobío
LLOO-209	Autoriza	La Isla	Los Ángeles	Bíobío
LLOO-210	Autoriza	Rinconada de Huaqui	Los Ángeles	Bíobío
LLOO-213	Autoriza	San Luis	Los Ángeles	Bíobío
LLOO-226	Autoriza	Casas de Pile	Mulchén	Bíobío
LLOO-229	Autoriza	San Roque	Nacimiento	Bíobío
LLOO-202	Autoriza	Coyanco	Negrete/Los Ángeles	Bíobío
LLOO-216	Autoriza	Primer Agua	Penco	Bíobío
LLOO-227	Autoriza	Piñiquihue	Quilaco	Bíobío
LLOO-218	Autoriza	Río Pardo	Quilleco	Bíobío
LLOO-301	Autoriza	Canteras Manzanar	Quilleco	Bíobío
LLOO-228	Autoriza	Bajos de Peñaflo	San Rosendo	Bíobío
LLOO-225	Autoriza	Cerro Negro	Santa Bárbara	Bíobío
LLOO-207	Autoriza	Quilquilco	Tirúa	Bíobío
LLOO-230	Autoriza	Villa Rastrojos	Tucapel	Bíobío
LLOO-231	Autoriza	Vega Blanca	Yumbel	Bíobío
LLOO-17	Autoriza	San Marcos	Combarbalá	Coquimbo
LLOO-19	Autoriza	Las Cardas	Coquimbo	Coquimbo
LLOO-24	Autoriza	Cañas Dos	Illapel	Coquimbo
LLOO-330	Autoriza	La Tórtola	La Higuera	Coquimbo
LLOO-16	Autoriza	Santa Eliza	La Serena	Coquimbo
LLOO-23	Autoriza	Los Corrales	La Serena	Coquimbo
LLOO-25	Autoriza	La Estrella	La Serena	Coquimbo
LLOO-32	Autoriza	Tamelcura	Monte Patria	Coquimbo
LLOO-20	Autoriza	La Calera - Vicuña	Vicuña	Coquimbo
LLOO-21	Autoriza	Villa Puclaro	Vicuña	Coquimbo
LLOO-60	Autoriza	Santa Celia	Carahue	La Araucanía
LLOO-53	Autoriza	Huerere	Cunco	La Araucanía
LLOO-71	Autoriza	Santa Ema	Curacautín	La Araucanía
LLOO-81	Autoriza	Pidima	Ercilla	La Araucanía
LLOO-35	Autoriza	Huilio	Freire	La Araucanía
LLOO-48	Autoriza	Chucauco	Freire	La Araucanía
LLOO-55	Autoriza	Quetrahue	Freire	La Araucanía
LLOO-73	Autoriza	9 de Julio	Freire	La Araucanía
LLOO-47	Autoriza	Fortín Nielol	Galvarino	La Araucanía
LLOO-61	Autoriza	Pelantaro	Galvarino	La Araucanía
LLOO-74	Autoriza	Ranquilco - Rucamanque	Galvarino	La Araucanía
LLOO-77	Autoriza	Pelahuenco	Galvarino	La Araucanía
LLOO-79	Autoriza	Botacura	Gorbea	La Araucanía
LLOO-84	Autoriza	Rucahue Chantelfu	Loncoche	La Araucanía
LLOO-78	Autoriza	Guadaba	Los Sauces	La Araucanía
LLOO-342	Autoriza	Llaima Alto	Melipeuco	La Araucanía

LLOO	ESTADO FINAL	Nombre	Comuna	Región
LLOO-357	Autoriza	Huacanilahue	Nueva Imperial	La Araucanía
LLOO-39	Autoriza	Rulo	Nueva Imperial	La Araucanía
LLOO-57	Autoriza	Quilaco Loma Larga	Nueva Imperial	La Araucanía
LLOO-58	Autoriza	Quilaco Membrillar	Nueva Imperial	La Araucanía
LLOO-59	Autoriza	Quillem	Perquenco	La Araucanía
LLOO-302	Autoriza	Huallizada, Los Galpones	Pitrufquén	La Araucanía
LLOO-38	Autoriza	Reserva Mahuidanche	Pitrufquén	La Araucanía
LLOO-45	Autoriza	Carhuello	Pucón	La Araucanía
LLOO-352	Autoriza	Temo	Saavedra	La Araucanía
LLOO-64	Autoriza	Puacho	Saavedra	La Araucanía
LLOO-54	Autoriza	Conoco Grande	Temuco	La Araucanía
LLOO-83	Autoriza	Chanco Bajo	Traiguén	La Araucanía
LLOO-70	Autoriza	Relun	Villarrica	La Araucanía
LLOO-285	Autoriza	Los Canelos	Chépica	Libertador Bernardo O'Higgins
LLOO-284	Autoriza	Pidihuinco Alto	Chimbarongo	Libertador Bernardo O'Higgins
LLOO-280	Autoriza	Millahue	Coinco	Libertador Bernardo O'Higgins
LLOO-278	Autoriza	Guadalao	La Estrella	Libertador Bernardo O'Higgins
LLOO-287	Autoriza	El Cajón	Litueche	Libertador Bernardo O'Higgins
LLOO-282	Autoriza	La Quebrada y la Prita	Marchihue	Libertador Bernardo O'Higgins
LLOO-276	Autoriza	Tierra Chilena	Nancagua	Libertador Bernardo O'Higgins
LLOO-281	Autoriza	La Polcura	Navidad	Libertador Bernardo O'Higgins
LLOO-266	Autoriza	Santa Irene	Palmilla	Libertador Bernardo O'Higgins
LLOO-275	Autoriza	La Población	Paredones	Libertador Bernardo O'Higgins
LLOO-267	Autoriza	Santa Amelia	Pichidegua	Libertador Bernardo O'Higgins
LLOO-269	Autoriza	Poblacion 1 de Mayo	Pichidegua	Libertador Bernardo O'Higgins
LLOO-270	Autoriza	San Roberto	Pichidegua	Libertador Bernardo O'Higgins
LLOO-272	Autoriza	San Luis	Pichidegua	Libertador Bernardo O'Higgins
LLOO-354	Autoriza	Los Yuyos	Pichidegua	Libertador Bernardo O'Higgins
LLOO-288	Autoriza	La Quebrada	Pichilemu	Libertador Bernardo O'Higgins
LLOO-264	Autoriza	La Dehesa	Placilla	Libertador Bernardo O'Higgins
LLOO-271	Autoriza	Lo Moscoso	Placilla	Libertador Bernardo O'Higgins
LLOO-286	Autoriza	Rincon La Mina	Pumanque	Libertador Bernardo O'Higgins
LLOO-273	Autoriza	Carrizal	Quinta de Tilcoco	Libertador Bernardo O'Higgins
LLOO-268	Autoriza	Los Cerrillos	Rengo	Libertador Bernardo O'Higgins
LLOO-319	Autoriza	Las Peñas	San Fernando	Libertador Bernardo O'Higgins
LLOO-263	Autoriza	Apalta	Santa Cruz	Libertador Bernardo O'Higgins
LLOO-265	Autoriza	La Lajuela	Santa Cruz	Libertador Bernardo O'Higgins
LLOO-112	Autoriza	Aguas Buenas	Ancud	Los Lagos
LLOO-103	Autoriza	Huito	Calbuco	Los Lagos
LLOO-123	Autoriza	Isla Quehui	Castro	Los Lagos
LLOO-86	Autoriza	Huillinco	Chonchi	Los Lagos
LLOO-89	Autoriza	Terao	Chonchi	Los Lagos
LLOO-92	Autoriza	Rauco	Chonchi	Los Lagos
LLOO-122	Autoriza	Cruce Palqui	Curaco de Vélez	Los Lagos
LLOO-87	Autoriza	Tegüel	Dalcahue	Los Lagos
LLOO-110	Autoriza	Parga	Fresia	Los Lagos
LLOO-105	Autoriza	Colonia La Radio	Frutillar	Los Lagos
LLOO-119	Autoriza	Línea Solar	Llanquihue	Los Lagos
LLOO-344	Autoriza	Miramar	Los Muermos	Los Lagos
LLOO-113	Autoriza	Coyam	Mauullín	Los Lagos
LLOO-88	Autoriza	Tres Cumbres	Mauullín	Los Lagos
LLOO-96	Autoriza	Olmopulli	Mauullín	Los Lagos

Subsecretaría de Telecomunicaciones
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones



LLOO	ESTADO FINAL	Nombre	Comuna	Región
LLOO-345	Autoriza	Trocomo	Osorno	Los Lagos
LLOO-101	Autoriza	Salto Chico	Puerto Montt	Los Lagos
LLOO-85	Autoriza	Huelmo	Puerto Montt	Los Lagos
LLOO-107	Autoriza	Nochaco	Puerto Octay	Los Lagos
LLOO-99	Autoriza	Colonia Tres puentes	Puerto Varas	Los Lagos
LLOO-108	Autoriza	Chulchuy	Puqueldón	Los Lagos
LLOO-93	Autoriza	Ichuac	Puqueldón	Los Lagos
LLOO-102	Autoriza	Colonia Ponce	Purranque	Los Lagos
LLOO-106	Autoriza	Quema del Buey	Puyehue	Los Lagos
LLOO-115	Autoriza	Corral del Sur	Puyehue	Los Lagos
LLOO-118	Autoriza	Apeche	Queilén	Los Lagos
LLOO-94	Autoriza	Santa Rosa, Candelaria, Tutil, Agua Fresca	Quellón	Los Lagos
LLOO-109	Autoriza	Aucho	Quemchi	Los Lagos
LLOO-90	Autoriza	Chaulinec	Quinchao	Los Lagos
LLOO-98	Autoriza	Isla Alao	Quinchao	Los Lagos
LLOO-104	Autoriza	Buenaventura	Río Negro	Los Lagos
LLOO-111	Autoriza	Quisquelelfun	Río Negro	Los Lagos
LLOO-114	Autoriza	San Florentino	Río Negro	Los Lagos
LLOO-116	Autoriza	Ñancuan	Río Negro	Los Lagos
LLOO-117	Autoriza	Casa de lata	Río Negro	Los Lagos
LLOO-95	Autoriza	Chan chan	Río Negro	Los Lagos
LLOO-97	Autoriza	Huilma	Río Negro	Los Lagos
LLOO-100	Autoriza	Pucatrihue	San Juan de la Costa	Los Lagos
LLOO-134	Autoriza	Cumuleufu	La Unión	Los Ríos
LLOO-130	Autoriza	Panguinilahue	Lanco	Los Ríos
LLOO-133	Autoriza	Purey	Los Lagos	Los Ríos
LLOO-313	Autoriza	Cudico	Máfil	Los Ríos
LLOO-328	Autoriza	Rucaco	Mariquina	Los Ríos
LLOO-126	Autoriza	Santa Rosa	Paillaco	Los Ríos
LLOO-128	Autoriza	Nueva Esperanza	Río Bueno	Los Ríos
LLOO-139	Autoriza	Bahía Chilota	Porvenir	Magallanes
LLOO-249	Autoriza	La Posada	Cauquenes	Maule
LLOO-253	Autoriza	Lagunillas	Chanco	Maule
LLOO-251	Autoriza	Las Cabras	Colbún	Maule
LLOO-261	Autoriza	Las Corrientes	Constitución	Maule
LLOO-333	Autoriza	Las Lomas	Curepto	Maule
LLOO-240	Autoriza	El Maitén	Curicó	Maule
LLOO-362	Autoriza	Las Buiteras	Curicó	Maule
LLOO-339	Autoriza	Los Sauces	Hualañé	Maule
LLOO-335	Autoriza	Los Junquillos	Licantén	Maule
LLOO-336	Autoriza	Llankanao	Linares	Maule
LLOO-259	Autoriza	Los Copihues	Longaví	Maule
LLOO-241	Autoriza	Cerrillo Bascañan	Molina	Maule
LLOO-248	Autoriza	Alupenhue	Molina	Maule
LLOO-250	Autoriza	Buena Fé	Molina	Maule
LLOO-358	Autoriza	La Valdesina	Molina	Maule
LLOO-244	Autoriza	Huencuecho	Pelarco	Maule
LLOO-247	Autoriza	Lihueno	Pelarco	Maule
LLOO-243	Autoriza	Quilicura el rey	Pelluhue	Maule
LLOO-260	Autoriza	Las Garzas	Rauco	Maule
LLOO-236	Autoriza	Romeral	Retiro	Maule
LLOO-237	Autoriza	Quillaimo	Retiro	Maule

LLOO	ESTADO FINAL	Nombre	Comuna	Región
LLOO-246	Autoriza	Mantul	Retiro	Maule
LLOO-252	Autoriza	San Nicolás	Retiro	Maule
LLOO-255	Autoriza	Cuñao	Retiro	Maule
LLOO-360	Autoriza	Curipeumo	Retiro	Maule
LLOO-239	Autoriza	Porvenir	Río Claro	Maule
LLOO-258	Autoriza	Rincón de Mellado	Sagrada Familia	Maule
LLOO-242	Autoriza	Cabrería Alto	San Javier	Maule
LLOO-245	Autoriza	Santa Rosa	San Javier/Maule	Maule
LLOO-346	Autoriza	Ruta K-40	San Rafael	Maule
LLOO-257	Autoriza	Hulliborgoa	Talca	Maule
LLOO-238	Autoriza	Ventana del Bajo	Teno	Maule
LLOO-235	Autoriza	Santa Ana de Queri	Yerbas Buenas	Maule
LLOO-256	Autoriza	Isla Penciahue	Parral / Ñiquen	Maule/ Ñuble
LLOO-290	Autoriza	Hacienda Alhue	Alhué	Metropolitana
LLOO-305	Autoriza	El Canelo	Colina	Metropolitana
LLOO-289	Autoriza	Miraflores	Curacaví	Metropolitana
LLOO-300	Autoriza	Paico Alto	El Monte	Metropolitana
LLOO-294	Autoriza	Baracaldo	María Pinto	Metropolitana
LLOO-308	Autoriza	La Palma	María Pinto/Curacaví	Metropolitana
LLOO-295	Autoriza	Codigua	Melipilla	Metropolitana
LLOO-304	Autoriza	Abrantes	Paine	Metropolitana
LLOO-306	Autoriza	Cardonal Bajo	Paine	Metropolitana
LLOO-307	Autoriza	Nuevo Sendero	Paine	Metropolitana
LLOO-291	Autoriza	San Vicente	Pirque	Metropolitana
LLOO-296	Autoriza	San Gabriel	San José de Maipo	Metropolitana
LLOO-309	Autoriza	Quincanque	San Pedro	Metropolitana
LLOO-292	Autoriza	Montenegro	Tiltil	Metropolitana
LLOO-152	Autoriza	Libuy y Camino 3 Marías	Bulnes	Ñuble
LLOO-142	Autoriza	Quinquhua	Chillán	Ñuble
LLOO-156	Autoriza	Huechupin	Chillán	Ñuble
LLOO-173	Autoriza	Copiulemu	Cobquecura	Ñuble
LLOO-161	Autoriza	Los Queñes	Coihueco	Ñuble
LLOO-144	Autoriza	Maipo Abajo	El Carmen	Ñuble
LLOO-145	Autoriza	Rinconada de Diguillín	El Carmen	Ñuble
LLOO-151	Autoriza	Maipo Arriba	El Carmen	Ñuble
LLOO-153	Autoriza	San Vicente Alto	El Carmen	Ñuble
LLOO-157	Autoriza	Puente Urrutia	El Carmen	Ñuble
LLOO-158	Autoriza	Trehualemu Norte	El Carmen	Ñuble
LLOO-162	Autoriza	Mata Redonda	El Carmen	Ñuble
LLOO-169	Autoriza	La Isla	Ninhue	Ñuble
LLOO-143	Autoriza	Cruce la gloria	Ñiquén	Ñuble
LLOO-149	Autoriza	Tiuquelemu	Ñiquén	Ñuble
LLOO-163	Autoriza	Huenutil del Peumo	Ñiquén	Ñuble
LLOO-170	Autoriza	El Saltillo	Pemuco	Ñuble
LLOO-167	Autoriza	Llahuen Bajo	Portezuelo	Ñuble
LLOO-159	Autoriza	El Arenal	Quillón	Ñuble
LLOO-171	Autoriza	Concuyo	Quirihue	Ñuble
LLOO-160	Autoriza	Flor de Quihua	San Carlos	Ñuble
LLOO-164	Autoriza	Junquillo	San Carlos	Ñuble
LLOO-165	Autoriza	Ex Escuela La Ermita	San Ignacio	Ñuble
LLOO-166	Autoriza	Curica	San Nicolás	Ñuble
LLOO-168	Autoriza	Antiquereo	Treguaco	Ñuble

LLOO	ESTADO FINAL	Nombre	Comuna	Región
LLOO-146	Autoriza	Curapaso	Yungay	Ñuble
LLOO-148	Autoriza	Ranchillo Bajo	Yungay	Ñuble
LLOO-155	Autoriza	San Miguel de Itata	Yungay	Ñuble
LLOO-338	Autoriza	San José	Algarrobo	Valparaíso
LLOO-190	Autoriza	Las Puertas	Cabildo	Valparaíso
LLOO-184	Autoriza	Baños de Auco	Calle Larga/Rinconada	Valparaíso
LLOO-193	Autoriza	El Turco	Cartagena	Valparaíso
LLOO-191	Autoriza	Las Dichas	Casablanca	Valparaíso
LLOO-197	Autoriza	La Higuera Sur	Concón	Valparaíso
LLOO-189	Autoriza	Lo Rojas	La Cruz	Valparaíso
LLOO-188	Autoriza	Casas Viejas	La Ligua	Valparaíso
LLOO-194	Autoriza	El Naranjal	Llailay	Valparaíso
LLOO-180	Autoriza	Sector Rural El Melon	Nogales	Valparaíso
LLOO-214	Autoriza	La Vega	Olmué	Valparaíso
LLOO-347	Autoriza	Palomar Interior	Panquehue	Valparaíso
LLOO-340	Autoriza	El Tome	Papudo	Valparaíso
LLOO-186	Autoriza	El Sobrante	Petorca	Valparaíso
LLOO-199	Autoriza	El Cardal	Puchuncaví	Valparaíso
LLOO-196	Autoriza	Los Patos	Putendo	Valparaíso
LLOO-183	Autoriza	Cuncumén	San Antonio	Valparaíso
LLOO-185	Autoriza	Los Chacayes	San Esteban	Valparaíso
LLOO-187	Autoriza	San Enrique	Santo Domingo	Valparaíso
LLOO-181	Autoriza	La Hacienda Catapilco	Zapallar	Valparaíso
